

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA
SEINFRA



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



EXERCÍCIO 2024

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
URBANA – SEINFRA**



Assinado com senha por ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA em 07/03/2025 - 06:52hs.
Documento Nº: 437301.2909929-5281 - consulta à autenticidade em
<http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=437301.2909929-5281>



SEINFRAOFI202500422

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA - SEINFRA**

**RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2024**

Relatório Anual de Gestão do exercício de
2024 elaborado de acordo com a Resolução
TCE/AC nº 087/2013 e IN CGM n.º004/2023.

RIO BRANCO/AC, 2025



SEINFRAOFI202500422

LISTAS

QUADROS

Quadro 1: Identificação do Órgão.....	13
Quadro 2: Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária.....	18
Quadro 3: Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico – Infraestrutura (Código na LOA: 301)	19
Quadro 4 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo::Eixo Estratégico – Infraestrutura (Código na LOA: 0403 -parte)	20
Quadro 5 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo:: Eixo Estratégico – Infraestrutura (Código na LOA: 0404 -parte)	21
Quadro 6 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico – Infraestrutura (Código na LOA: 0603 -parte)	22
Quadro 7 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Eixo Estratégico - Infraestrutura	23
Quadro 8 - Resultados Alcançados pelo Programa Asfalta Rio Branco (2024)	30
Quadro 9 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária.....	36
Quadro 10 - Classificação dos novos programas habitacionais do município.....	37
Quadro 11 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Gestão Pública	39
Quadro 12: Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Gestão Administrativa.....	39
Quadro 13: Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Prevenção e Controle de Desastres	40
Quadro 14: Demonstrativo da Composição das Receitas Executadas	42
Quadro 15: Programação das Despesas Correntes	43
Quadro 16 Programação das Despesas de Capital	44
Quadro 17: Despesa Total Do Órgão.....	44
Quadro 18: Contratos de Repasse na Gestão atual	46
Quadro 19 - Convênios na Gestão atual	50
Quadro 20 - Termos de Compromisso (PAC) na Gestão atual.....	53
Quadro 21 - Contratos de Financiamento (PAC) na Gestão atual	54
Quadro 22 - Quadro de pessoal da SEINFRA.....	59
Quadro 23 - Instrumentos Financeiros em acompanhamento.	62
Quadro 24 - Contratos de Repasse 2021-2024.....	63
Quadro 25 - Convênios 2021-2024.....	68
Quadro 26 – Demandas e Ações Realizadas pela Diretoria de Projetos por Tipologia	



(2021)	75
Quadro 27 – Demandas e Ações Realizadas pela Diretoria de Projetos por Tipologia (2022).....	75
Quadro 28 – Demandas e Ações Realizadas pela Diretoria de Projetos por Tipologia (2023).....	76
Quadro 29 – Demandas e Ações Realizadas pela Diretoria de Projetos por Tipologia (2024).....	76
Quadro 30 – Ações realizadas pela Diretoria de Regularização Fundiária.....	81
Quadro 31 - Ações realizadas pela Diretoria de Licenciamento e Aprovação de Projetos.....	82
Quadro 32 – Manutenção/Reforma de Praças e Parques – 2021.....	86
Quadro 33 - Manutenção/Reforma de Quadras e Campos de Futebol - 2021.....	87
Quadro 34 - Manutenção Preventiva e Corretiva Em Calçadas - 2021.....	88
Quadro 35 - Manutenção de Vias Urbanas - 2021	88
Quadro 36 - Manutenção Predial Preventiva e Corretiva - 2021.....	88
Quadro 37 – Melhoria de Ramais – 2021.....	88
Quadro 38 - Manutenção/Reforma de Praças e Parques - 2022	89
Quadro 39 - Manutenção/Reforma de Quadras e Campos de Futebol - 2022.....	89
Quadro 40 - Manutenção de Equipamentos Públicos - 2022.....	91
Quadro 41 - Manutenção de Academias - 2022.....	91
Quadro 42 - Melhorias para Escoamento da Produção	92
Quadro 43 - Construção de Academias Populares	92
Quadro 44 - Sistema de Drenagem Municipal de Rio Branco.....	93
Quadro 45 - Programação de Calçadas.....	93
Quadro 46 - Construção de Praças e Quadras.....	93
Quadro 47 - Manutenção de Academias - 2022.....	93
Quadro 48 - Melhorias para Escoamento da Produção	94
Quadro 49 - Construção de Academias Populares	95
Quadro 50 - Sistema de Drenagem Municipal de Rio Branco.....	95
Quadro 51 - Programação de Calçadas.....	96
Quadro 52 - Construção de Praças e Quadras.....	96
Quadro 53 - Sistema de Drenagem	96
Quadro 54 - Manutenção/Reforma de Quadras e Campos de Futebol.....	96
Quadro 55 - Manutenção/Reforma de Praças e Parques	98
Quadro 56 - Manutenção de Equipamentos Públicos.....	98
Quadro 57 - Manutenção de Vias Urbanas - 2023.....	98
Quadro 58 - Pavimentação de Vias Urbanas - 2023.....	98



Quadro 59 - Construção e Manutenção de Pontes e Passarelas - 2023	98
---	----

FIGURAS

Figura 1: Dados Gerais do Município	11
Figura 2: Organograma do Órgão	14
Figura 3: Trecho da Lei Complementar Nº 299/2024	24
Figura 4: Extensão de pavimentação realizada dentro do Programa Asfalta Rio Branco, em km, por regionais (abr – dez 2024)	28
Figura 5: Organograma da Diretoria de Gestão Administrativa.....	56
Figura 6: Quantidade de contratos realizados durante a Gestão 2021-2024	58
Figura 7: Organograma da Diretoria de Planejamento.....	59
Figura 8: Organograma da Diretoria de Projetos.....	70
Figura 9: Situação das Demandas da Diretoria de Projetos por tipologia (2021).....	75
Figura 10: Situação das Ações da Diretoria de Projetos por tipologia (2021)	75
Figura 11: Situação das Demandas da Diretoria de Projetos por tipologia (2022) ...	76
Figura 12: Situação das Ações da Diretoria de Projetos por tipologia (2022)	76
Figura 13: Situação das Demandas da Diretoria de Projetos por tipologia (2023) ...	77
Figura 14: Situação das Ações da Diretoria de Projetos por tipologia (2023)	77
Figura 15: Situação das Demandas da Diretoria de Projetos por finalidade (2024) .	78
Figura 16 Situação das Ações da Diretoria de Projetos por finalidade (2024)	78
Figura 17: Organograma da Diretoria de Regularização Fundiária	79
Figura 18: Organograma da Diretoria de Licenciamento e Aprovação de Projetos ..	80
Figura 19: Organograma da Diretoria de Habitação de Interesse Social	81

ABREVIATURAS

SEINFRA: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

FMHIS: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

RBTRANS: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito

EMURB: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

SMC: Secretaria Municipal da Cidade

SEOP: Secretaria Municipal de Obras Públicas

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

PPA: Plano Plurianual

LOA: Lei Orçamentária Anual

LDO: Lei de Diretrizes Orçamentárias

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica



SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA
SEINFRA



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica

CMU: Conselho Municipal de Urbanismo

TCE: Tribunal de Contas do Estado



Assinado com senha por ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA em 07/03/2025 - 06:52hs.
Documento Nº: 437301.2909929-5281 - consulta à autenticidade em
<http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=437301.2909929-5281>



SEINFRAOFI202500422

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO	10
O Município	10
A Secretaria e seus Desafios	11
II. VISÃO GERAL	12
III. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL	15
1. Planejamento Governamental	15
2. Plano Plurianual – PPA 2022-2025.....	18
3. Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024.....	23
4. Análise dos Resultados Alcançados – Programa:Modernização da Infraestrutura e de Equipamentos Públicos.....	25
4.1 Ação: Investimento em Equipamentos Públicos.....	25
4.2 Ação: Plano Diretor do Município de Rio Branco.....	26
4.3 Ação: Revitalização e manutenção de Equipamentos Públicos	26
4.4 Ação: Manutenção de Vias Urbanas	27
4.5 Ação: Pavimentação de Vias Urbanas	27
4.6 Ação: Melhoria da Infraestrutura Viária para Escoamento da Produção	31
4.7 Ação: Revisão dos códigos e Legislações	31
4.8 Ação: Construção de Academias Populares	31
4.9 Ação: Sistema Drenagem Municipal de Rio Branco	31
4.10 Ação: Programa de Calçadas.....	31
4.11 Ação: Revitalização de praças, parques e áreas de lazer	32
4.12 Ação: Construção e Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias	33
4.13 Ação: Programa de Obras Públicas	34
5. Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária.....	37
5.1 Ação: Regularização fundiária de áreas urbana e rural.....	37
5.2 Ação: Programa de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais	37
5.3 Ação: Programa de Interesse Social de Arquitetura e Engenharia Pública	38
5.4 Ação: Programa de Lotes Sociais de Interesse Social em Parcerias	38
5.5 Ação: Programa 1001 Dignidades.....	38
5.6 Ação: Programa Minha Dignidade	38
6. Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Gestão Pública (parte)	41
6.1 Ação: Construção do Edifício Sede da Câmara Municipal de Rio Branco.....	41
7. Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Gestão Administrativa (parte) ..	41



7.1 Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA.....	41
8. Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Prevenção e Controle de Desastres (parte).....	41
8.1 Ação: Manutenção do Programa Defesa Civil na Comunidade – SEINFRA.....	41
9. Execução Orçamentária e Financeira	42
9.1 Receita	42
9.2 Despesas	42
IV. SITUAÇÃO DEIXADA PELA ADMINISTRAÇÃO 2017 A 2020.....	45
1. Estrutura Física de Trabalho.....	45
2. Quadro de Pessoal	45
3. Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Compromisso e Contratos de Financiamento	45
V. SITUAÇÃO NA GESTÃO ATUAL.....	55
1. Estrutura Física da Secretaria	55
2. Estrutura Organizacional da Secretaria	56
2.1 Diretoria de Gestão Administrativa	58
2.2 Diretoria de Planejamento.....	61
2.3 Diretoria de Projetos	74
2.4 Diretoria de Regularização Fundiária.....	81
2.5 Diretoria de Licenciamento e Aprovação de Projetos	82
2.6 Diretoria de Habitação de Interesse Social.....	83
3. Ações da SEINFRA na Gestão 2021-2023.....	86
3.1 Serviços executados no exercício de 2021.....	86
3.2 Serviços executados no exercício de 2022	88
3.3 Serviços executados no exercício de 2023	94
VI. PRINCIPAIS DESTAQUES DE SERVIÇOS E PROJETOS REALIZADOS EM 2024 PELA SEINFRA.....	100
1. Ação: Investimentos em Equipamentos Públicos	100
2. Ação: Plano Diretor do Município de Rio Branco	103
3. Ação: Revitalização e Manutenção de Equipamentos Públicos	104
4. Ação: Manutenção de Vias Urbanas	108
5. Ação: Pavimentação de Vias Urbanas	110
6. Ação: Melhoria da Infraestrutura Viária para escoamento da Produção.....	128
7. Ação: Qualificação da Infraestrutura de Corredores de Transporte Público (antigo)	129
8. Ação: Construção e Manutenção de Academias Populares	130
9. Ação: Programa de Calçadas	131
10. Ação: Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer.....	132
11. Ação: Construção e Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias	132
12. Ação: Modernização e Revitalização Administrativa	134
13. Ação: Programa de Obras Públicas.....	135



14. Alagação 2024	136
15. Aquisição de Máquinas e Equipamentos	137
VII. RESULTADOS E CONCLUSÕES.....	139



I. INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), cuja existência se extrai do art. 39, I, alínea “g”, item 7, da Lei Municipal nº 1.959, de 20 de fevereiro de 2013, é órgão integrante da Administração Direta do Município de Rio Branco, tendo como principais funções a administração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, do plano de regularização fundiária, do Programa de Habitação de interesse social, além de estabelecer diretrizes para a regularização urbanística e fundiária, a fiscalização do comércio ambulante e das obras e edificações públicas, entre outras competências previstas no art. 40-A, XIII, da referida Lei. Dessa forma, zela pelo desenvolvimento e planejamento urbano do Município de Rio Branco.

Para alcançar seu mister, o Decreto nº 103, de 22 de janeiro de 2024, estabeleceu a estrutura organizacional básica da SEINFRA, criando o gabinete do Secretário, o do Secretário Adjunto, além de 8 (oito) diretorias, quais sejam: a Diretoria de Gestão Administrativa; a Diretoria de Planejamento; a Diretoria de Projetos; a Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas; a Diretoria de Regularização Fundiária; a Diretoria de Licenciamento e Aprovação de Projetos; a Diretoria de Habitação e Interesse Social; e a Diretoria de Fiscalização Urbanística.

Ademais, estão vinculados à SEINFRA o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social (FMHIS); a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS); a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) e os Conselhos Municipal de Urbanismo, de Desenvolvimento da Cidade e de Recursos Fiscais.

Essa estrutura foi pensada de forma a otimizar e racionalizar os serviços públicos prestados. As atividades da Secretaria são fundamentais para promover o bem-estar social, o desenvolvimento da produção e do comércio, a melhoria das vias e ramais, a prestação de serviços públicos e a geração de empregos.

O Município

Localizada às margens do Rio Acre e recebendo seu nome em homenagem ao diplomata brasileiro José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, Rio Branco é a capital do Estado do Acre e, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)¹, possui área territorial de 8.835,154km². Apresenta população estimada em 387.852 (trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois) pessoas. É, hoje, é a sexta maior cidade da Região Norte.

¹ Dados do IBGE 2024, disponível em <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ac/rio-branco.html>.



Figura 1 – Dados Gerais do Município



Área da unidade territorial:

8.835,154 km²

Área urbana (2019): 87,42 km²

População residente estimada: 387.852

Corredores de transporte: 378km

Linhas de ônibus: 51

Veículos: 200.467

Fonte: IBGE, Ministério da Infraestrutura e Própria, 2024.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura², Rio Branco possui 220.467 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e sete) veículos, sendo 76.755 automóveis, 5.348 caminhões, 104.383 motocicletas, 1.388 ônibus/micro-ônibus e 32.593 outras espécies de veículos.

A Secretaria e seus Desafios

Conforme já mencionado, a SEINFRA tem como função a administração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, do plano de regularização fundiária, do Programa de Habitação de interesse social, além de estabelecer diretrizes para a regularização urbanística e fundiária, a fiscalização do comércio ambulante e das obras e edificações públicas, entre outras competências previstas no art. 40-A, XIII, da referida Lei.

É também a Secretaria responsável pela execução de obras de implantação e manutenção da infraestrutura da cidade, que hoje certamente é o maior desafio enfrentado por nossa comunidade.

² Dados do Ministério da Infraestrutura acessado em 23 de set. de 2024, disponível em <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/frota-de-veiculos-2024>.



II. VISÃO GERAL

Criada em 1º de janeiro de 2019 a partir da Lei Complementar Nº 54 de 07/12/2018 que promoveu a junção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Secretária Municipal da Cidade, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA, tem como competências: o gerenciamento da infraestrutura, mobilidade urbana, obras públicas, licenciamento de obras, responsabilidade sob o Plano Diretor, a regularização fundiária, gestão territorial, fiscalização integrada e gestão de espaços públicos.

Assim, conforme definido na Lei, são competências institucionais da SEINFRA:

- a) Coordenar, implementar, controlar, avaliar e atualizar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município e demais legislações urbanísticas promovendo o adequado ordenamento territorial;
- b) Promover intercâmbio técnico entre os diversos órgãos afins e de planejamento urbano no âmbito municipal, estadual, regional e nacional, bem como elaborar estudos, pesquisas, planos e projetos nas áreas de habitação, infraestrutura e gestão territorial;
- c) Implementar, coordenar, monitorar, gerenciar e executar o plano de regularização fundiária municipal, inclusive no que se refere ao Banco de Terras Municipais;
- d) Analisar e emitir relatórios técnicos quanto às diretrizes a serem adotadas, consoante às legislações pertinentes, nos processos administrativos que visem à regularização fundiária, o cadastramento e/ou parcelamento dessas áreas;
- e) Elaborar diagnósticos técnicos voltados à gestão territorial para a regularização fundiária do Município, nas áreas particulares e públicas;
- f) Coordenar, supervisionar e realizar vistorias técnicas em processos de regularização fundiária, análise de banco de terras, áreas de risco e outras relacionadas ao controle territorial e a política habitacional do Município;
- g) Elaborar e implementar o Programa de Habitação de interesse social, com a execução de um plano habitacional que objetive a diminuição do déficit habitacional social;
- h) Manter o funcionamento dos Conselhos Municipais de Habitação de Interesse Social e de Urbanismo, como órgãos deliberativos;
- i) Estabelecer diretrizes para a regularização urbanística e fundiária em ações conjuntas com as demais secretarias municipais, visando à implementação e institucionalização dos processos de regularização;
- j) Coordenar e prestar assistência técnica no que diz respeito às suas competências legais para a elaboração projetos habitacionais de interesse social, conforme previsão legal municipal;
- k) Estabelecer diretrizes para a gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, bem como para os programas anuais e plurianuais quanto à aplicação dos recursos do Fundo nos programas de habitação popular;
- l) Promover a implementação das diretrizes e normas gerais relativas à política de habitação em conformidade com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município, objetivando a identificação de áreas para desenvolvimento de projetos habitacionais;
- m) Manter atualizado um banco de dados com informações sobre o quantitativo de unidades habitacionais do município, bem como do déficit habitacional de modo a compatibilizá-las com a oferta de moradia e as necessidades da comunidade;



SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA
SEINFRA



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

- n) Aprovar os projetos de implantação e regularização de loteamentos para fins urbanos, com a expedição das respectivas licenças necessárias, em atenção à legislação municipal pertinente, bem como atestar o cumprimento do projeto aprovado.
- o) Aprovar projetos de desmembramentos e desmembramentos, com a finalidade de compatibilizá-los com a política de racionalização do uso do solo.
- p) Promover a interdição de empreendimentos localizados em zonas incompatíveis com o uso;
- q) Fiscalizar o comércio ambulante e fazer aplicar a legislação relativa a essa atividade;
- r) Gerir os fundos vinculados a Secretaria na forma que dispuser lei específica;
- s) Conduzir os processos relativos às solicitações para ocupação dos espaços públicos, espaço aéreo, locação e funcionamento de atividades econômicas;
- t) Administrar os mercados, centros de compras e demais espaços públicos objeto de concessão;
- u) Elaborar projetos, executar diretamente ou contratar serviços para construção de edifícios, obras paisagísticas e demais obras caracterizadas como edificações públicas;
- v) Promover a abertura e pavimentação de vias da rede municipal;
- w) Administrar a execução e fiscalização de obras e edificações públicas quando realizadas diretamente pelo Município, bem como fiscalizar aquelas que forem feitas pelo regime de empreitada;
- x) Verificar e liberar os processos de conclusão de obras e empreitadas;
- y) Executar programas habitacionais objetivando a construção de casas populares;
- z) Planejar, coordenar e supervisionar a política e as ações relacionadas à mobilidade urbana.


Quadro 1 - Identificação do Órgão

Denominação completa: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA	
Denominação abreviada: SEINFRA	
Código LOA: 01.017.001.000	
Telefones de contato:	(68) 3212-7440
E-mail: seinfra.riobranco@gmail.com	
Endereço Postal: Rua Rui Barbosa nº 325 – Bairro Centro CEP : 69908-084	
Normas relacionadas ao Órgão	
Normas de Criação e alteração: Lei Municipal nº1.959 de 20/02/2013, sendo alterada pela Lei nº2.032 de 27/12/2013, Lei nº 2.225 de 23/02/2017 e Lei Complementar nº54 de 07/12/2018 e Lei Complementar 73 de 05/11/2019, Lei Complementar nº132 de 25/01/2022	
Outras normas relacionadas: Decreto nº 138 de 06/01/2023, Decreto nº 103 de 22/01/2024	
Unidades vinculadas	
Código	Nome
1.017.202	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS)
1.017.501	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB)
01.017.613	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social (FMHIS)



SEINFRAOFI202500422

Figura 2 – Organograma do Órgão

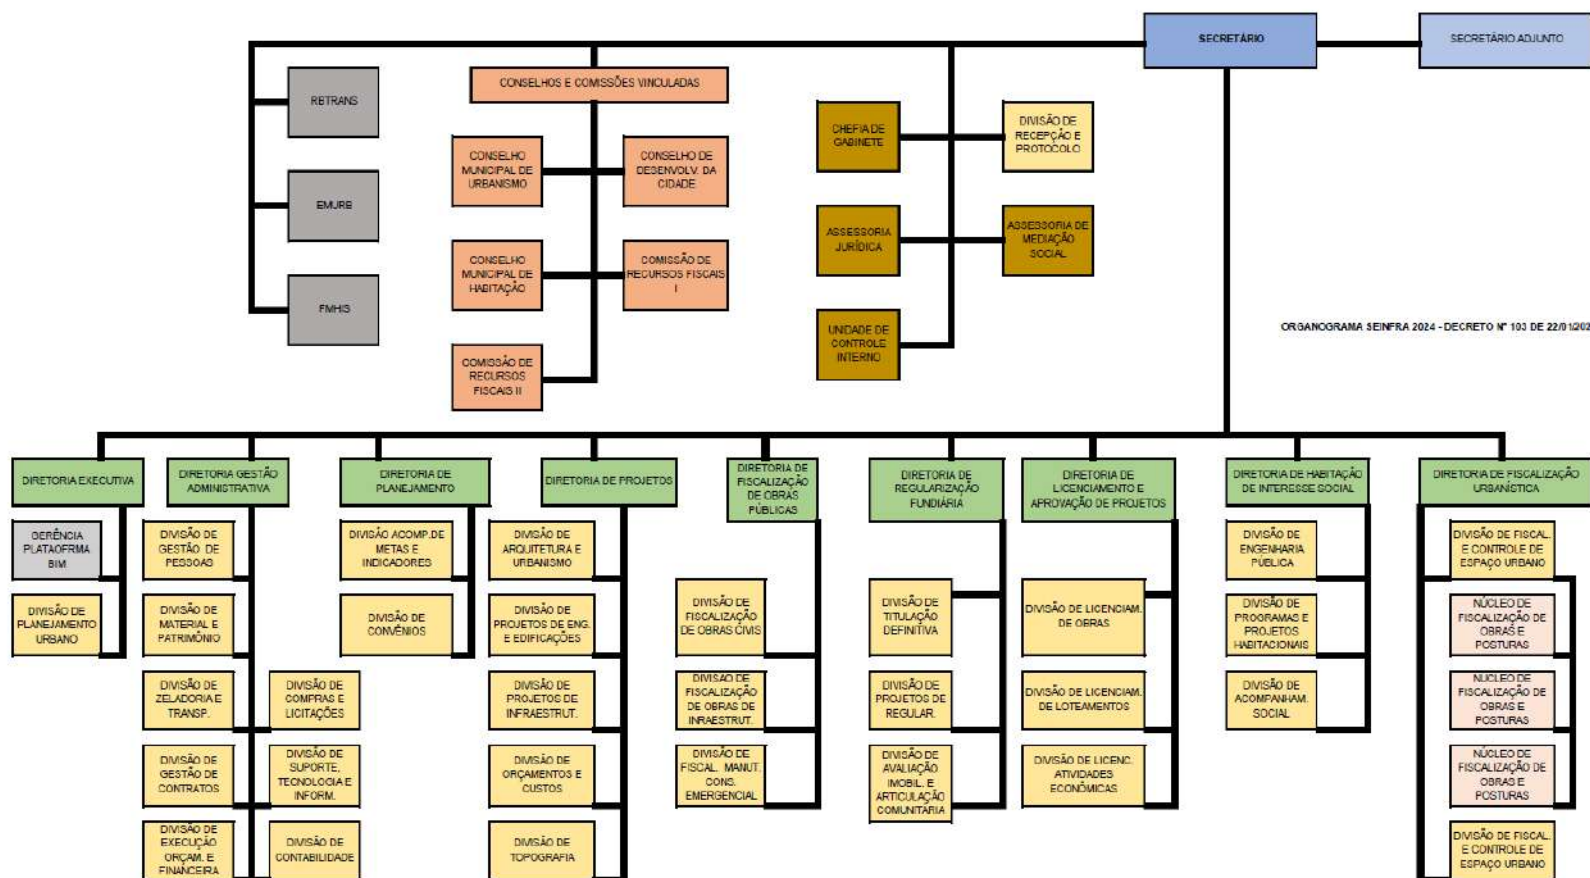

Fonte: Prefeitura de Rio Branco, 2024; elaboração própria.



SEINFRAOF1202500422

III. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL

Sobretudo no que se refere à área de infraestrutura, a gestão da SEINFRA encontrará sempre diversos desafios que são permanentes, entre eles:

- Crescimento desordenado da cidade: bairros originados de invasões e loteamentos irregulares, que não possuem infraestrutura adequada;
- Fadiga do pavimento antigo: ausência de recapeamentos no curso dos anos;
- Aumento da percepção dos buracos nas ruas: crescimento vertiginoso do volume de ruas pavimentadas x problemas construtivos do Programa Ruas do Povo;
- Características do solo e do clima;
- Carência orçamentária e financeira: demanda muito maior que a capacidade de atendimento.

Em 2024, ocorreu a segunda maior alagação da história do município de Rio Branco, tendo atingido a cota de 17,89m no Rio Acre, ultrapassando a cota de alerta (13,50m) e também a cota de transbordamento (14m).

O município declarou Situação de Emergência por meio do Decreto Nº 256 de 26 de fevereiro de 2024.

Também ocorreu o transbordamento de 8 igarapés que cortam a cidade de Rio Branco: Igarapé Almoço, Igarapé Sao Francisco, Igarapé Dias Martins, Igarapé Batista, Igarapé da ETA, Igarapé Judia, Igarapé Fundo e Igarapé Liberdade, atingindo casas, lojas, comércio e outros estabelecimentos, afetando diretamente 51 bairros e 23 comunidades rurais do município de Rio Branco/AC. Mais de 4 mil pessoas ficaram desabrigadas e mais de 70 mil foram afetadas direta ou indiretamente.

Tivemos um prejuízo maior por conta das intempéries climáticas, pois o ano se revelou com muita incidência de chuvas, considerando que o total de precipitação acumulada em Rio Branco no ano de 2024 até 30 de abril foi de mais de 965,4mm.

Esse fator contribuiu diretamente para o impacto negativo no ritmo de trabalho da Secretaria.

1. Planejamento Governamental

Na elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, a gestão buscou mudanças de forma a integrar todos os segmentos e áreas técnicas da Prefeitura de Rio Branco na construção dos Programas Temáticos.

Inicia-se em 2022 o Plano Plurianual dentro da Gestão atual, tendo agora dentro do eixo temático de infraestrutura, **os Programas 0301 - Modernização da Infraestrutura e de Equipamentos Públicos, e 0302 - Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária**, que visa Desenvolver ações que possam melhorar a mobilidade, fluidez, segurança e cidadania para os transportes e o trânsito na cidade de Rio Branco.

Destacam-se as seguintes ações do programa 0301:



- Investimento em equipamentos públicos;
- Plano Diretor do Município de Rio Branco;
- Revitalização e manutenção de equipamentos públicos;
- Manutenção de vias urbanas;
- Pavimentação de Vias Urbanas;
- Melhoria da infraestrutura viária para escoamento da produção;
- Revisão dos códigos de legislações;
- Construção de Academias Populares;
- Sistema de Drenagem Municipal de Rio Branco;
- Programa de calçadas;
- Revitalização de praças, parques e áreas de lazer;
- Construção e manutenção de pontes, passarelas e escadarias;
- Modernização e revitalização administrativa;
- Programa de obras públicas;

O Programa 0302 - Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária, visa melhorar as condições de habitabilidade de populações residentes em assentamentos humanos precários, para a regularização fundiária e para a redução de riscos mediante sua urbanização, tendo como ações:

- Regularização fundiária urbana e rural;
- Programa de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais;
- Programa de Interesse Social de Arquitetura e Engenharia;
- Programa de Lotes de Interesse Social em Parcerias;
- Programa 1001 Dignidades;
- Programa Minha Dignidade;
- Programa de Regularização Fundiária.

Para elaboração do Plano, foram realizados levantamentos da situação do município, através de reuniões com todos os agentes políticos envolvidos afim de reunir informações do maior número de segmentos da sociedade, buscando-se a melhora na interpretação da realidade situacional do município, com a interligação dos diversos compromissos e políticas do governo. O PPA foi pensado como instrumento para identificar as prioridades do governo, considerando a tendência à escassez de recursos.

Neste sentido, foram desenvolvidas ações com base nas diretrizes estratégicas para o cumprimento das metas, de modo a possibilitar o monitoramento e avaliação destas em consonância com o PPA, utilizando também a LOA para visualizar a



movimentação do orçamento no exercício corrente.

Dentro do que se apresenta a Lei Complementar nº 289 de 08 de janeiro de 2024, que estima a Receita do Município de Rio Branco para o exercício financeiro de 2024 e fixa a Despesa em igual valor, de acordo com o artigo 165, §5º da Constituição Federal e com o art. 77, §5º da Lei Orgânica do Município, **para SEINFRA**, apresenta uma disponibilidade de recursos no montante de R\$ 539.114.540,00 (quinhentos e trinta e nove milhões, cento e quatorze mil, quinhentos e quarenta reais), sendo que R\$ 144.248.030,00 (cento e quarenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e oito mil e trinta reais) são oriundos de recursos próprios e R\$ 394.866.510,00 (trezentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dez reais), de recursos provenientes de outras fontes.



2. Plano Plurianual – PPA 2022-2025.

Quadro 2 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária.

Código na LOA: 0302					
Denominação do Programa: Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária					
Objetivo: Melhorar as condições de habitabilidade de populações residentes em assentamentos humanos precários, para a regularização fundiária e para a redução de riscos mediante sua urbanização.					
Órgão responsável: SEINFRA					
Desempenho do Programa no exercício de 2024					
Valor total		Investimento		Manutenção	
LOA (a)	Empenhado (b)	LOA (c)	Empenhado (d)	LOA (e)	Empenhado (f)
12.000.060,00	6.378.095,08	11.998.037,00	6.378.095,08	2.023,00	0,00
% (b/a)*100:	53,15%	% (d/c)*100:	53,16%	% (f/e)*100:	0,00%
Monitoramento da evolução dos indicadores					
Indicador	Fonte	Índice mais recente (a)	Desejado ao final do PPA (b)	Índice atual (c)	% Realização (c-a)*(100/(b-a))
Imóveis Urbanos Regularizados	SEINFRA	73,43	80,00	75,33	28,9%
Desempenho orçamentário e financeiro no exercício de 2024					
Dotação Atualizada	Despesa			Restos a Pagar	
6.414.148,92	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
	6.378.095,08	4.567.163,87	4.567.163,87	0,00	1.810.931,21
Desempenho orçamentário e financeiro acumulado - 2022/2025					
Dotação Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
8.298.725,44	6.572.639,97	4.567.163,87	4.567.163,87	0,00	1.810.931,21

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2025



Quadro 3 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico - Infraestrutura

Código na LOA: 0301					
Denominação do Programa: Modernização da Infraestrutura e de Equipamentos Públicos.					
Objetivo: Modernizar o município de Rio Branco com infraestrutura e equipamentos públicos que ofereçam qualidade de vida e acessibilidade, assegurando o bem-estar da população.					
Órgão responsável: SEINFRA					
Desempenho do Programa no exercício de 2024					
Valor total		Investimento		Manutenção	
LOA (a)	Empenhado (b)	LOA (c)	Empenhado (d)	LOA (e)	Empenhado (f)
272.318.513,00	354.961.706,92	81.671.217,00	278.506.130,06	190.647.296,00	76.455.576,86
% (b/a)*100: 130,35%		% (d/c)*100: 341,01%		% (f/e)*100: 40,10%	
Monitoramento da evolução dos indicadores					
Indicador	Fonte	Índice mais recente (a)	Desejado ao final do PPA (b)	Índice atual (c)	% Realização (c-a)*(100/(b-a))
Investimento público em infraestrutura	SEINFRA	23,98	30	13,94	-166,3%
Calçadas Acessíveis	SEINFRA	17,38	28	18,37	10,6%
Desempenho orçamentário e financeiro no exercício de 2024					
Dotação Atualizada	Despesa			Restos a Pagar	
428.431.026,04	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
	354.961.706,92	270.118.110,41	270.118.110,41	0,00	84.843.596,51
Desempenho orçamentário e financeiro acumulado - 2022/2025					
Dotação Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
841.652.129,61	613.160.766,96	494.211.362,62	494.211.362,62	0,00	118.949.404,34

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2025.



SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA
SEINFRA



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

Quadro 4 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico - Infraestrutura

Código na LOA: 0403						
Denominação do Programa: Gestão Pública						
Objetivo: Modernizar a administração pública com foco na eficiência dos serviços prestados à população do município de Rio Branco.						
(Construção do Edifício Sede da Câmara Municipal de Rio Branco)						
Órgão responsável: SEINFRA (apenas parte).						
Desempenho do Programa no exercício de 2024						
Valor total		Investimento		Manutenção		
LOA (a)	Empenhado (b)	LOA (c)	Empenhado (d)	LOA (e)	Empenhado (f)	
1.000.000,00	1.189.491,77	1.000.000,00	1.189.491,77	0,00	0,00	
% (b/a)*100: 118,95%		% (d/c)*100: 118,95%		% (f/e)*100: 0%		
Desempenho orçamentário e financeiro no exercício de 2024						
Dotação Atualizada		Despesa		Restos a Pagar		
1.460.000,00		Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
		1.189.491,77	1.189.491,77	1.189.491,77	0,00	0,00
Desempenho orçamentário e financeiro acumulado - 2022/2025						
Dotação Final		Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
16.661.001,00		12.491.216,32	1.189.491,77	1.189.491,77	0,00	9.901.000,00

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2025.



SEINFRAOFI202500422

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA
SEINFRA



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

Quadro 5 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico - Infraestrutura

Código na LOA: 0404						
Denominação do Programa: Gestão Administrativa						
Objetivo: Prover os órgãos municipais dos meios administrativos para a gestão de seus programas.						
(Manutenção Administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA)						
Órgão responsável: SEINFRA (apenas parte)						
Desempenho do Programa no exercício de 2024						
Valor total		Investimento		Manutenção		
LOA (a)	Empenhado (b)	LOA (c)	Empenhado (d)	LOA (e)	Empenhado (f)	
28.942.000,00	21.225.819,17	0,00	0,00	28.942.000,00	21.225.819,17	
% (b/a)*100: 73,34%		% (d/c)*100: 0,00%		% (f/e)*100: 73,34%		
Desempenho orçamentário e financeiro no exercício de 2024						
Dotação Atualizada		Despesa			Restos a Pagar	
22.860.048,13		Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
		21.225.819,17	20.682.074,05	20.682.074,05	0,00	543.745,12
Desempenho orçamentário e financeiro acumulado - 2022/2025						
Dotação Final		Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
53.019.786,99		47.461.108,39	41.852.446,06	41.852.357,28	0,00	2.298.237,88

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2025.



SEINFRAOFI202500422

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA
SEINFRA



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

Quadro 6 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico - Infraestrutura

Código na LOA: 0603					
Denominação do Programa: Prevenção e Controle de Desastres					
Objetivo: Fortalecer as ações de Defesa Civil para benefício da população no município de Rio Branco.					
Manutenção do Programa Defesa Civil na Comunidade - SEINFRA					
Órgão responsável: SEINFRA (apenas parte)					
Desempenho do Programa no exercício de 2024					
Valor total		Investimento		Manutenção	
LOA (a)	Empenhado (b)	LOA (c)	Empenhado (d)	LOA (e)	Empenhado (f)
2,00	8.086.407,41	0,00	0,00	2,00	8.806.407,41
% (b/a)*100:	404.320.370,5	% (d/c)*100:	0,00	% (f/e)*100:	404.320.370,50
Desempenho orçamentário e financeiro no exercício de 2024					
Dotação Atualizada		Despesa		Restos a Pagar	
8.086.408,41		Empenhada	Liquidada	Paga	Processados
		8.086.407,41	8.086.407,41	8.086.407,41	0,00
					Não Processados
					0,00
Desempenho orçamentário e financeiro acumulado - 2022/2025					
Dotação Final		Empenhada	Liquidada	Paga	Processados
40.406.784,10		40.406.779,10	40.135.955,53	40.135.955,53	0,00
					Não Processados
					0,00

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2025.



SEINFRAOFI202500422

3. Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024

Quadro 7 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Eixo Estratégico - Infraestrutura

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA									
Programa: Modernização da Infraestrutura e de Equipamentos públicos							Código na LOA: 0301		
Ação	Produto	Meta Física 2024			Dotação (R\$)		Despesa Acumulada (R\$)		
		Previs- ta (a)	Realizada acumulada (b)	% (b*100)/a	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Investimento em equipamentos públicos	Equipamentos construídos	10	12	120%	28.035.000,00	32.774.733,79	30.589.602,92	8.473.963,45	8.473.963,45
Plano Diretor do Município de Rio Branco	Plano Revisado	1	1	100%	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização e manutenção de equipamentos públicos	Equipamentos revitalizados e mantidos	30	30	100%	3.000.000,00	5.520.339,34	5.514.919,41	5.514.919,41	5.514.919,41
Manutenção de vias urbanas	Vias mantidas (km)	500	126,14	25,23%	172.325.295,00	208.088.995,55	174.383.473,62	162.847.313,52	162.847.313,52
Pavimentação de vias urbanas	Vias pavimentadas (km)	10	195,3	1953%	23.498.570,00	76.925.841,61	75.605.720,20	65.024.726,35	65.024.726,35
Melhoria da infraestrutura viária para escoamento da produção	Ramais melhorados (km)	600	14,71	2,5%	9.180.000,00	7.181.288,50	6.404.320,40	1.715.062,00	1.715.062,00
Revisão dos códigos e legislações	Código Revisado	1	0	0%	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



Construção e manutenção de academias populares	Academias construídas	5	4	80%	1.524.284,00	292.324,87	263.740,87	103.676,12	103.676,12
Sistema de drenagem municipal de Rio Branco	Intervenções realizadas	15	0	0%	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Programa de calçadas	Calçadas construídas e revitalizadas (m)	6	12	200%	1.200.000,00	1.750.000,00	1.686.998,26	1.427.924,90	1.427.924,90
Revitalização de praças, parques e áreas de lazer	Praças/parques/área de lazer readequadas	45	1	0%	9.822.000,00	11.351.192,64	8.229.333,75	6.623.770,78	6.623.770,78
Construção e manutenção de pontes, passarelas e escadarias	Intervenções realizadas	40	13	32,5%	5.000.000,00	8.757.113,00	8.755.522,00	6.284.205,59	6.284.205,59
Programa de obras públicas	Programas realizados	1	1	100%	25.750.000,00	69.852.991,20	42.504.365,65	11.249.029,08	11.249.029,08
Qualificação da Infraestrutura de Corredores de Transporte Público	-	-	-	-	4.700.000,00	4.506.202,54	1.023.709,84	853.519,21	853.519,21
Manutenção das Atividades de Fiscalização	-	-	-	-	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 1001 Dignidades	Programa Institucionalizado	1			11.000.020,00	6.414.108,92	6.378.095,08	4.567.163,87	4.567.163,87
Programa Minha Dignidade	Programa Institucionalizado	1			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Regularização Fundiária	Programa Institucionalizado	1			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Diretoria de Obras e Diretoria de Planejamento, Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas – SEINFRA e Sistema WebPúblico e Lei Complementar nº 239 de 07.08.2023 – DOE 09.08.2023, 2025.



4. Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Modernização da Infraestrutura e de Equipamentos Públicos

4.1 Ação: Investimento em Equipamentos Públicos

Em 2024 foram realizadas 12 (doze) ações direcionadas a investimentos em equipamentos públicos, superando a meta prevista dentro da LDO 2024, de 10 equipamentos construídos. Destacamos a construção da **Elevatória de Esgoto do Bairro da Paz**.



Também tivemos a construção de 5 Quadras e campos de futebol, com 4 finalizadas:



Vila Ivonete



Israel Lira



Castelo Branco



Jequitibá



4.2 Ação: Plano Diretor do Município de Rio Branco

No ano de 2024, foram realizadas atividades internas de revisão do texto para montagem do Projeto de Lei de revisão do Plano Diretor. Em fevereiro, o projeto foi finalizado, com a tradução das informações técnicas para a linguagem jurídica. A minuta do Projeto de Lei foi então entregue às autoridades competentes.

Em 20 de Maio de 2024, foi promulgada a Lei Complementar Nº 299, que altera o Plano Diretor do Município.

Figura 3 – Trecho da Lei Complementar Nº 299/2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE,

Nos termos do §7º do art. 40 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O art. 164 da Lei nº 2.222, de 26 de dezembro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:

ADI 1 E 2- ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	
USOS PERMITIDOS	UIPE, UES E IND 1 E 2 CSI E CSI 2- permitido somente para os usos industriais com o fim de comercialização de seus produtos e atividade de distribuição e atacado.
FORMAS DE PARCELAMENTO PERMITIDAS	TODAS- apenas na ADI 2
LOTE ÁREA MIN. (m²)	2500m² somente na ADI 2
COEFIC. APROVEITAMENTO MÁXIMO	DE ACORDO COM A ZONA QUE ESTIVER INSERIDA
TAXA DE OCUPAÇÃO MÁX (%)	DE ACORDO COM A ZONA QUE ESTIVER INSERIDA
TAXA DE PERMEABILIDADE mín (%)	DE ACORDO COM A ZONA QUE ESTIVER INSERIDA
Nº DE PAVIMENTOS (máx)	4

"Art. 164.

(NR) "

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco, 20 de maio de 2024

Embora tais medidas não tenham demandado recursos financeiros, representam um passo adiante de extrema importância para a concretização e otimização dos serviços prestados à população rio branquense.

4.3 Ação: Revitalização e Manutenção de Equipamentos Públicos

Em 2024, foram executadas 30 (trinta) ações de revitalização e manutenção de equipamentos públicos, atingindo 100% da meta prevista. As atividades de manutenção contemplaram as mais diversas localizações e instalações, como manutenção de academias populares, mercados, terrenos, instalações, praças e quadras.



Intervenção de desvio do Igarapé para construção de ponte



4.4 Ação: Manutenção de Vias Urbanas

As ações direcionadas a manutenção de vias urbanas abrangeram 126,14km de vias que receberam serviços de tapa buraco, totalizando uma aplicação de mais de 46 toneladas de massa asfáltica. Destaca-se também a execução de remendo profundo em cerca de 63 mil m² de vias. Ao todo, cerca de 621 ruas foram atendidas em todas as regionais da capital.



Manutenção da Avenida Epaminondas Jácome

A realização dessa ação resultou em um significativo aumento da durabilidade das vias, proporcionando maior segurança e conforto para todos os usuários, além de contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

4.5 Ação: Pavimentação de Vias Urbanas

Em 2024, as ações voltadas para a pavimentação de vias urbanas resultaram na pavimentação de 195,3 km de ruas, atingindo um impressionante percentual de 1953% da meta estabelecida para o ano. Esse resultado expressivo é um reflexo do lançamento do **Programa Asfalto Rio Branco**.


O **Programa Asfalto Rio Branco** foi criado com o objetivo de garantir a tráfegabilidade e a infraestrutura urbana de qualidade e contempla serviços de **execução, manutenção, recuperação e recomposição de pavimentos, reparos nas redes de drenagem, água e esgoto, execução de calçadas etc.** visa resolver um dos maiores desafios enfrentados pela capital: a falta de manutenção e a precariedade das ruas, que há anos afetam a qualidade de vida da população. Com isso, o município tem investido fortemente em melhorias nas dez regionais de Rio Branco, com uma ampla frente de trabalho em todas as áreas da cidade.

“Ele contempla asfalto, calçamento padronizado, paisagismo, drenagem. Tudo isso para que a cidade fique realmente bonita em condições da população ter o seu ir e vir, sem nenhum tipo de problema”, destaca o prefeito Tião Bocalom.

A seguir, os principais serviços executados dentro do programa:



- Remendo Profundo

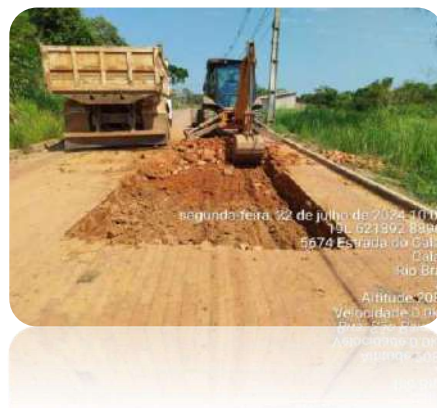

- Troca e Instalação de tubos de drenagem



- Reconstrução



- **Compactação**



- **Pavimentação**



- **Tapa Buraco**




Quadro 8 – Resultados Alcançados pelo Programa Asfalta Rio Branco (2024)

Regional	Nº Bairros Trabalhados	Nº Ruas trabalhadas	Extensão trabalhada	Remendo Profundo	Tapa-Buraco	Recapeamento/pavimentação
Belo Jardim	5	28	9.018 m	8.893 m²	8.060m²	18.145 m²
Calafate	8	52	23.753 m	17.818 m²	7.162 m²	27.360 m²
Estação Experi.	10	35	23.713 m	13.324 m²	11.827 m²	22.638 m²
Baixada	4	13	3.988 m	0 m²	0 m²	14.573 m²
Seis de Agosto	8	31	11.595 m	6.104 m²	10.340 m²	26.615 m²
Tancredo Neves	11	77	25.457 m	13.279 m²	22.665 m²	62.286 m²
Vila Acre	8	67	16.925 m	21.163 m²	10.079 m²	8.766 m²
Cadeia Velha	8	36	16.104 m	3.501 m²	0 m²	0 m²
Floresta	9	81	26.773 m	1.258 m²	1.989 m²	14.510 m²
São Francisco	6	44	13.534 m	14.656 m²	3.795 m²	36.584 m²
Total	77	464	170.860 m	99.996 m²	75.917 m²	231.477 m²

Fonte: Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas - SEINFRA, 2025.

Figura 4 - Extensão de pavimentação realizada dentro do Programa Asfalta Rio Branco, em km, por regionais (abr – dez 2024)

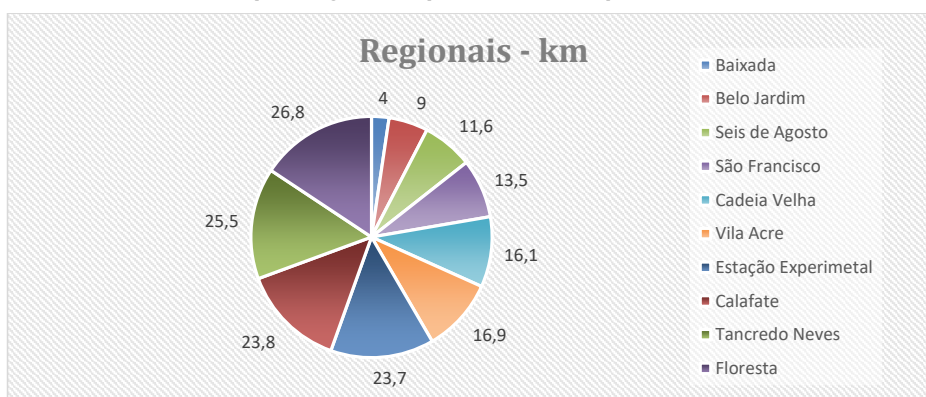

Fonte: Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas – SEINFRA, 2025.



4.6 Ação: Melhoria da Infraestrutura Viária para Escoamento da Produção

Embora estes serviços encontrem-se sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agropecuária – SEAGRO, a SEINFRA foi responsável pela execução de uma ação de melhoria de ramais em 2024, atuando nos ramais Vertente e Colibri com a melhoria de cerca de 14,71km.



Ramal Vertente



Ramal Estrada Velha

4.7 Ação: Revisão dos códigos e legislações

Não houve revisão de códigos e legislações durante o ano de 2024.

4.8 Ação: Construção de Academias Populares

A meta para o período foi 80% concluída, com a construção de 2 (duas) academias populares nos Bairros: Recanto dos Buritis e Ramal do Benfica. Outras 2 (duas) obras de construção de academias estão em andamento, nos bairros: Xavier Maia e Estação Experimental.

4.9 Ação: Sistema Drenagem Municipal de Rio Branco

As principais ações de drenagem do período foram realizadas dentro dos programas de pavimentação de vias, não sendo necessária a utilização de recursos deste programa.

4.10 Ação: Programa de Calçadas

A execução dessa meta está prevista entre construções e revitalizações de calçadas, numa largura em média 1,5m. Sendo executada na Rua Monte Roraima, Rua Mutum e Avenida Antônio da Rocha Viana. A meta foi cumprida e superada.





4.11 Ação: Revitalização de praças, parques e áreas de lazer

Grande parte das ações de manutenção de praças, parques e áreas de lazer foi realizada dentro da ação de manutenção de equipamentos públicos. Dentro desta ação, houve manutenção na Praça da Revolução e instalação de decoração natalina na praça e arredores.

- Decoração Natalina 2024





4.12 Ação: Construção e Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias

As ações de construção e manutenção de pontes, passarelas e escadarias no ano de 2024 foram executadas em diversos pontos da cidade de Rio Branco. Podemos citar: ponte sobre o Igarapé da Judia, ponte sobre o Igarapé Caipora, ponte sobre o Igarapé Redenção e a construção de passarela interligando os bairros Aeroporto Velho e Ayrton Senna.



4.13 Ação: Programa de Obras Públicas

Este Programa contempla algumas das ações de maior destaque da SEINFRA em 2024, por exemplo:

1. Elevado Bethe Bocalom (Estrada Dias Martins/Araújo Mix): O primeiro viaduto da cidade de Rio Branco, é uma obra que visa a melhoria da mobilidade urbana e redução de congestionamentos, especialmente entre a Estrada dias Martins e a Avenida Ceará. Atualmente, a obra encontra-se em fase de finalização.



2. Viaduto Mamed Bittar (Av. Ceará/AABB): O viaduto será construído na confluência das avenidas Ceará, Dias Martins e Isaura Parente. A obra é orçada em R\$ 24 milhões e deve melhorar a mobilidade na região, que é muito congestionada, principalmente nos horários de pico. A construção do viaduto vai diminuir o tempo de espera para travessia, já que cerca de 14 mil veículos passam pela região diariamente.



3. Praça com contenção de Encosta na Orla do Rio Acre: esta obra visa revitalizar a orla do Rio Acre no trecho na área central de Rio Branco, promovendo a integração do espaço com a orla e a melhoria da infraestrutura de lazer. A obra está em fase inicial de execução.

4. Novo Mercado Elias Mansour: a construção do novo mercado a promoção da infraestrutura urbana da cidade no que diz respeito a melhoria e ampliação de espaços de comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, pescado, produtos alimentícios e outras atividades comerciais, proporcionando o desenvolvimento econômico e social no Município.





5. Indústria de Produção de Leite de Soja (Vaca Mecânica): o projeto de longa data do prefeito, de criar um complexo industrial de leite de soja com distribuição gratuita para escolas da rede pública e pessoas com intolerância a lactose, está saindo do papel agora em 2024. Com o investimento de recurso próprio de R\$ 2,5 milhões em estrutura, maquinário e implementação de tecnologias, a ideia da Prefeitura de Rio Branco é produzir até 8 mil litros de leite e distribuir em escolas, nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e em postos de saúde mediante receita que comprove a sua necessidade (oaltoacre.com). Atualmente, a obra encontra-se em fase de acabamento final.



Quadro 9 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana									
Programa: 0302- Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária							Código na LOA: 0302		
Ação	Produto	Meta Física 2024			Dotação (R\$)		Despesa 2024 (R\$)		
		Prevista (a)	Realizada (b)	% (b*100)/a	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Regularização fundiária urbana e rural	Famílias Atendidas	500	302	60,4%	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais	Unidades provisionadas	200	16	8%	996.966,00	996.996,00	0,00	0,00	0,00
Programa de interesse social de arquitetura e engenharia	Edificações regularizadas	50	3	6%	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Lotes de Interesse Social em parcerias	Lotes sociais	200	0	0	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Diretoria de Planejamento, Diretoria de Habitação e Interesse Social, Diretoria de Desenvolvimento e Regularização Fundiária – SEINFRA e Sistema WebPúblico e Lei Complementar nº 239 de 07.08.2023 – DOE 09.08.2023, 2025.

*Os recursos utilizados para a execução das ações são referentes a Manutenção da Secretaria, sendo despesas com pessoal terceirizado, pagamentos de RRT's e ART's, locação de veículos, material de consumo, locação de impressora e computadores etc.



5. Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária

5.1 Ação: Regularização fundiária urbana e rural

Em 2024, foram emitidos 302 (trezentos e dois) títulos definitivos localizados em bairros diversos, um aumento de mais de 300% em comparação ao realizado em todo ano de 2023. O destaque vai para a regularização dos lotes do Bairro Santo Afonso, onde foram entregues as unidades habitacionais objeto do Termo de Compromisso firmado com o Ministério das Cidades que estava com pendências para cumprimento da obrigação de regularização das famílias retiradas do Nova Esperança e assentadas no Santo Afonso.

Os resultados do programa de regularização fundiária são extremamente positivos. A meta inicial foi superada, e o município continua a emitir títulos definitivos para os moradores, garantindo a segurança jurídica da posse de seus imóveis. A regularização de matrículas em diversos bairros já possibilitou a realização de obras públicas e abriu caminho para novos investimentos. O próximo passo é expandir o programa para outras áreas do município, garantindo que toda a população tenha acesso a esse importante benefício.

Válido destacar que regularização rural, em especial do Polos Agroflorestais da Prefeitura, não está sob a competência da SEINFRA, e sim da SEAGRO.

5.2 Ação: Programa de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais

Foram construídos 08 (oito) sobrados germinados (16 unidades habitacionais) no Loteamento Santo Afonso.

No ano de 2023 o Município realizou diversas ações de planejamento com o objetivo de identificar e cadastrar as famílias que serão beneficiadas pelos Programas habitacionais "1.001 Dignidades" e "Minha Dignidade", instituídos pelas Leis Complementares nº 272 e 274, respectivamente. Essas ações foram fundamentais para garantir a seleção transparente e justa dos beneficiários.

Os Programas mencionadas tem algumas características que os diferem entre si, que ficam sintetizadas na tabela a seguir:

Quadro 10 – Classificação dos novos programas habitacionais do município

Programa	Público Alvo	Tipologia	Observação
"1.001 Dignidades: Unidades Habitacionais de Interesse Social Sustentáveis" "Minha Dignidade"	Famílias de zonas alagadiças/Famílias do aluguel Social / Famílias que moram em fundos de vale	Casa de Madeira	Comodato de 20 anos
	População geral/Servidor Público efetivo municipal	Apartamentos e casas de alvenaria	Compra e doação

Fonte: Diretoria de Habitação de Interesse Social - SEINFRA, 2025.

Atualmente, os projetos encontram-se em andamento, com atividades de desafetação de áreas públicas, aquisição de novas áreas, e uso de imóveis próprios vazios. Para



uma segunda etapa do Programa 1001 Dignidades está em trâmite uma negociação de terrenos junto a Secretaria do Patrimônio da União.

5.3 Ação: Programa de Interesse Social de Arquitetura e Engenharia

No início do ano, em relação ao benefício PROMORE, houve a abertura de 8 (oito) processos, resultando em 3 (três) alvarás de construção entregues. Além disso, tivemos o início da execução de duas edificações atendidas pela Diretoria de Habitação de Interesse Social.

Em abril deste ano, a secretaria assumiu o programa 1001 DIGNIDADES, trabalhando nos seguintes loteamentos: Loteamento Santo Afonso, Loteamento Rosa Linda, Loteamento Juarez Távora, Loteamento Luis Israel Lira, Loteamento Vale do Carandá, Loteamento Bonsucesso II, Conjunto Rui Lino III, Conjunto Tucumã e Loteamento Portal da Amazônia. Também foi realizada a execução de dois protótipos de casas que serão entregues no referido programa.

5.4 Ação: Programa de Lotes Sociais de Interesse Social em parcerias

em relação ao benefício PROMORE, houve a abertura de 8 (oito) processos onde os mesmos seguem tramitando, resultando em 3 (três) alvarás de construção entregues, no qual houve o início da execução de duas edificações atendida por esta diretoria, onde uma está em fase final de acabamento.

5.5 Ação: Programa 1001 Dignidades

O 1001 Dignidades é dividido em 5 etapas. A primeira etapa é a aquisição de madeiras, por doação e compra. A segunda é a estruturação, com a obtenção de um galpão e de equipamentos. A terceira etapa, atualmente em execução, é a de fabricação de painéis. Atualmente estão sendo construídos painéis para os 772 lotes adquiridos pela prefeitura. A Prefeitura ainda deve adquirir 229 lotes para cumprir a meta de 1001 edificações. A quarta etapa são as obras de terraplanagem. Atualmente as obras estão ocorrendo no loteamento Santo Afonso, com 109 de seus 290 lotes sendo contemplados com as obras. A última etapa será a montagem final das casas.

Após a criação da LC 272/2023, houve:

- Formalização do contrato de compra e serragem de toras, em março/2024;
- Locação de máquinas para beneficiamento de madeiras;
- Formalização de processo de compra de insumos;
- Execução de terraplanagem de 6 (seis) quadras no loteamento Santo Afonso;
- Captação de recursos pelo pró-moradia para executar a etapa de infraestrutura;
- Montagem de painéis para construção das moradias.

5.6 Ação: Programa Minha Dignidade

- 06 (seis) lotes já estão aprovados pelo Ministério da Defesa para celebração de contrato e início de obras pelo Minha Casa, Minha Vida FAR 2023;
- 02 (dois) lotes possuem empresas selecionadas para construção pelo Minha Casa, Minha Vida Entidades – Terreno



Quadro 11 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Gestão Pública

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana									
Programa: 0403 - Gestão Pública (somente parte)							Código na LOA: 0403		
Ação	Produto	Meta Física 2024			Dotação (R\$)		Despesa 2024 (R\$)		
		Previst a(a)	Realizad a (b)	% (b*100)/a	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Construção do Edifício Sede da Câmara Municipal de Rio Branco	Sede construíd a	01	0	80,42%	1.000.000,00	1.460.000,00	1.189.491,77	1.189.491,77	1.189.491,77

Fonte: Diretoria de Planejamento e Diretoria de Fiscalização de Obras Púlicas – SEINFRA e Sistema WebPúblico e Lei Complementar nº 239 de 07.08.2023 – DOE 09.08.2023., 2025.

Quadro 12 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Gestão Administrativa

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana									
Programa: 0404 - Gestão Administrativa (somente parte)							Código na LOA: 0403		
Ação	Produto	Meta Física 2024			Dotação (R\$)		Despesa 2024 (R\$)		
		Previst a(a)	Realizad a (b)	% (b*100)/a	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA	Manuten ção realizada	01	01	100%	28.942.000,00	22.860.048,13	21.225.819,17	20.682.074,05	20.682.074,05

Fonte: Diretoria de Planejamento, Diretoria de Gestão Administrativa – SEINFRA e Sistema WebPúblico e Lei Complementar nº 239 de 07.08.2023 – DOE 09.08.2023, 2025.

*Os recursos utilizados para a execução das ações são referentes a Manutenção da Secretaria, sendo despesas com pessoal terceirizado, pagamentos de RRT's e ART's, locação de veículos, material de consumo, locação de impressora e computadores etc.



Quadro 13 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Prevenção e Controle de Desastres

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana									
Programa: 0603 - Prevenção e Controle de Desastres (somente parte)							Código na LOA: 0603		
Ação	Produto	Meta Física 2024			Dotação (R\$)		Despesa 2024 (R\$)		
		Previst a(a)	Realizad a (b)	% (b*100)/a	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Manutenção do Programa Defesa Civil na Comunidade - SEINFRA	Programa realizado	01	01	100%	2,00	8.086.408,41	8.086.407,41	8.086.407,41	8.086.407,41

Fonte: Diretoria de Planejamento, Diretoria de Gestão Administrativa – SEINFRA e Sistema WebPúblico e Lei Complementar nº 239 de 07.08.2023 – DOE 09.08.2023, 2025.

*Os recursos utilizados para a execução das ações são referentes a Manutenção da Secretaria, sendo despesas com pessoal terceirizado, pagamentos de RRT's e ART's, locação de veículos, material de consumo, locação de impressora e computadores etc.



6. Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Gestão Pública (parte)

6.1 Ação: Construção do Edifício Sede da Câmara Municipal de Rio Branco

Em 2023 foram iniciadas as obras de construção do edifício sede da Câmara Municipal de Rio Branco, localizado na Rua Alameda Itália no Bairro Jardim Europa, com conclusão prevista para o próximo ano. Atualmente, a obra encontra-se com 80,42% de execução, e está prevista para ser entregue no primeiro quadrimestre de 2025.

7. Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Gestão Administrativa (parte)

7.1 Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana -SEINFRA

As ações de manutenção da SEINFRA ocorreram durante todo o ano de 2024. Além da aquisição de diversos móveis como mesas, cadeiras, armários, gaveteiro, mesas de reunião, cadeiras de auditório etc., que colaboram com a modernização do espaço de atendimento ao público e também aos funcionários, a SEINFRA segue realizando seus compromissos quanto ao pagamento de terceirizados, pagamento de diárias, prestação de serviços diversos (sistemas, transporte, equipamentos etc), assim como aquisição de material de expediente etc.

8. Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Prevenção e Controle de Desastres (parte)

8.1 Ação: Manutenção do Programa Defesa Civil na Comunidade – SEINFRA

A COMDEC (Coordenadoria Municipal de Defesa Civil) da Prefeitura de Rio Branco, é o órgão responsável pela gestão e coordenação das ações de defesa civil no município, atuando de forma integrada com diversos órgãos municipais.

Diante da situação de emergência no município de Rio Branco devido as áreas alagadas e através do Decreto Municipal Nº 256 de 26 de fevereiro de 2024, a SEINFRA atuou junto à COMDEC na segurança da população e na redução dos impactos causados pela enchente, através de uma resposta rápida e eficiente na construção e implantação dos boxes e infra-estrutura necessária para atender as famílias atingidas, bem como a limpeza, retorno das famílias, recuperação e reconstrução das áreas afetadas.



9. Execução Orçamentária e Financeira em 2024

9.1 Receita

As receitas orçamentárias são recursos financeiros disponíveis que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público, viabilizando a execução das políticas públicas, cuja finalidade precípua é atender as necessidades da sociedade.

Apesar de contribuir na arrecadação de receitas (através de multas, pagamento de requerimentos de licenciamento, alvarás, etc), não é demonstrado o ingresso da receita de natureza orçamentária específica para SEINFRA, uma vez que o montante arrecadado ingressa diretamente no Tesouro Municipal.

Quadro 14 – Demonstrativo da Composição das Receitas Executadas

Categoria Econômica	2023		2022		2021		% ((a-b)/b)*100
	R\$ (a)	%	R\$ (a)	%	R\$ (b)	%	
Receitas Correntes (I)	0,00		0,00		0,00		
Receitas Tributárias							
Receitas de Contribuições							
Receitas Patrimoniais							
Receitas Industriais							
Receitas de Serviços							
Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes							
Receitas de Capital(II)	0,00		0,00		0,00		
Operações de Crédito							
Alienação de Bens							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
Total das Receitas (III) = (I+II)			0,00		0,00		

Obs.: Nada Consta

9.2 Despesas

As despesas resultam no desembolso de recursos que não possuem correspondência com os ingressos anteriores, são fixados em lei orçamentária e utilizados para pagamento de gastos públicos, fazendo parte da etapa de execução, que inclui o empenho, a liquidação e o pagamento.

São apresentados a seguir os resultados dos ingressos de natureza orçamentária e as despesas executadas no exercício, com base em informações de programação e



execução orçamentária e financeira, considerando os programas associados à SEINFRA.

Quadro 15 - Programação das Despesas Correntes

ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		Grupos de Despesas Correntes					
		Pessoal e Encargos sociais		Juros e Encargos da Dívida		Outras Despesas Correntes	
		Fixada	Empenhada	Fixada	Empenhada	Fixada	Empenhada
Dotação Inicial LOA		-	-	-	-	52.323.318,00	
Créditos	Suplementares	-	-	-	-	102.094.739,13	
	Especiais	-	-	-	-		-
	Extraordinários	-	-	-	-		-
	Cancelados	-	-	-	-	43.879.984,97	-
Outras Operações		-	-	-	-	-	-
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	110.538.072,16	110.388.779,89

Fonte: Sistema WebPúblico, 2025.

As despesas correntes, destinadas a manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos em geral, constituem despesas com encargos sociais, bem como para atender serviços de conservação de prédios, vias, equipamentos esportivos, pontes, passarelas e escadarias, não correspondendo em contrapartida direta em bens ou serviços.

Conforme podemos verificar no Quadro 13, no exercício de 2024, as despesas correntes empenhadas alcançaram o montante de R\$ 110.388.779,89 (cento e dez milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), sendo representado por 211% da dotação inicial fixada na LOA.

As despesas de capital constituem despesas da administração pública com a intenção de adquirir ou construir bens que contribuirão para a produção ou geração de bens ou serviços. Composta pelos investimentos, as despesas de capital são aplicadas em obras, aquisições de instalações, equipamentos e material permanente e resultam em acréscimo de patrimônio ou aumento de capital.

Os resultados obtidos em 2024, relativos à execução das despesas de capital, podem ser verificadas no Quadro 14, onde é possível observar que apesar do incremento de orçamento realizado, a execução encontra-se próxima de 102% do orçamento apresentado na LOA 2024 somando aos créditos suplementares.



Quadro 16 - Programação das Despesas de Capital

ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		Grupos de Despesas de Capital					
		Investimentos		Inversões Financeiras		Amortização da Dívida	
		Fixada	Empenhada	Fixada	Executada	Fixada	Executada
Dotação Inicial LOA		276.034.896,00		-	-	-	-
Créditos	Suplementares	129.217.491,85	-		-	-	-
	Especiais		-		-	-	-
	Extraordinários		-		-	-	-
	Cancelados	50.908.562,30	-		-	-	-
Outras Operações		-	-		-	-	-
Total		354.343.825,55	281.452.740,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema WebPúblico, 2025.

Quadro 17 - Despesa Total Do Órgão

Especificação	Despesa (R\$)	
	Empenhada	Paga
Modalidade de Licitação (I)	332.702.378,48	204.844.922,80
Convite	0,00	0,00
Tomada de Preços	4.464.306,73	1.963.144,75
Concorrência	269.752.704,82	169.076.697,18
Pregão Presencial	15.529.226,11	14.194.458,53
Pregão Eletrônico	42.854.704,73	19.521.025,09
Regime Diferenciado de Contratação	0,00	0,00
Adesão a Registro de Preços	101.456,09	89.597,25
Chamamento Público	0,00	0,00
Contratações Diretas (II)	74.754.310,81	61.092.534,13
Dispensa em razão do valor	563.718,28	129.651,57
Dispensa	72.186.037,18	59.846.239,12
Inexigibilidade	1.850.462,56	972.628,82
Sem Licitação	154.092,79	144.014,62
Diárias (III)	30.198,41	30.198,41
Convênios de Despesas (IV)	0,00	0,00
Outras Despesas (V)	0,00	0,00
Despesa Total do órgão (VI = I+...+V)	468.579.421,83	265.967.655,34

Fonte: Sistema WebPúblico e Diretoria de Gestão, 2025.



IV. SITUAÇÃO DEIXADA PELA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR (2017 A 2020).

1. Estrutura Física de Trabalho

A gestão anterior (2017-2020) deixou a Secretaria de Infraestrutura com um patrimônio móvel em estado avançado de deterioração. Mobiliário obsoleto e equipamentos de informática defasados comprometiam a saúde e a produtividade dos servidores, além de gerar prejuízos financeiros pela necessidade de constantes reparos. A aquisição de mobiliário novo e ergonômico, aliado à modernização da infraestrutura tecnológica, era imprescindível para garantir um ambiente de trabalho seguro, eficiente e adequado às demandas da atualidade.

A edificação da SEINFRA, situada na Rua Floriano Peixoto, 460, Bairro Base, demonstrava um quadro alarmante de deterioração e inadequação. A superlotação dos ambientes, aliada a uma planta inadequada, dificultava a circulação de pessoas e a realização das atividades, prejudicando a comunicação e a colaboração entre os setores. Adicionalmente, problemas estruturais como infiltrações, piso danificado e condições insalubres colocavam em risco a saúde e a segurança dos servidores, além de gerar um ambiente de trabalho desmotivante e pouco produtivo.

A SEINFRA operava em desacordo com a legislação de propriedade intelectual, utilizando de forma irregular softwares essenciais para suas atividades. A ausência de licenças para softwares de escritório, antivírus e, principalmente, para a plataforma BIM (AEC Autodesk), comprometia a segurança da informação, expunha a instituição a riscos de processos judiciais e limitava significativamente a capacidade de produção da equipe técnica. Com apenas 10 licenças ativas do AEC Autodesk, a utilização simultânea da ferramenta por diversos profissionais era inviabilizada, gerando gargalos e atrasos na execução dos projetos.

2. Quadro de Pessoal

A subdimensionamento do quadro de pessoal da SEINFRA gerava gargalos em todas as etapas dos processos, desde a elaboração de projetos até a fiscalização das obras. A falta de profissionais qualificados resultava em atrasos na entrega das obras, diminuição da qualidade dos serviços e exposição a riscos de desvios e irregularidades. A realização de um processo seletivo era fundamental para fortalecer a equipe, otimizar os processos e garantir a qualidade dos serviços prestados à população.

3. Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Compromisso e Contratos de Financiamento

Ao final da gestão 2017-2020 a SEINFRA possuía um número de 37 contratos de repasse, 18 Convênios, 4 Termos de Compromisso e 3 Contratos de Financiamento, conforme podemos observar nos quadros a seguir.



Quadro 18 - Contratos de Repasse na Gestão atual (2021-2024).

ORDEM	NÚMERO	OBJETO	ÓRGÃO CONCEDENTE	VALOR DO CONTRATO DE REPASSE R\$			OBSERVAÇÕES
				REPASSE (R\$)	CONTRAPAR- TIDA (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	265.393-43/2008	URBANIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - BAIRRO DA PAZ	Ministério do Desenvolvimento Regional	2.965.600,00	156.084,22	3.121.684,22	Meta: Construção de EEE em licitação em prazo de recurso administrativo
2	1009827-92/2013 SICONV 789198/2013	REVITALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CALÇADÃO DA ORLA DO RIO ACRE ACRE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	MTUR	2.925.000,00	121.875,00	3.046.875,00	Em reprogramação na CAIXA - Ofício 1591/GAB
3	1017808-96/2014 SICONV 805543/2014	REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.482.100,00	2.978,13	1.485.078,13	Projeto viário e de sinalização concluídos. Em elaboração de orçamento do
4	1015477-39/2014 SICONV 809413/2014	READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CORREDORES DO TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.482.100,00	21.227,03	1.503.327,03	Em execução (restando apenas a execução da sinalização)
5	1026338-21/2015 SICONV 824255/2015	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Cidadania	292.500,00	586,17	293.086,17	Metas iniciais concluídas. Ampliação de meta - academia no Raimundo Melo em licitação
6	1027701-48/2015 SICONV 825344/2015	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL AZIZ ABUCATER	MTUR	1.462.500,00	2.930,86	1.465.430,86	Em execução





7	1032354-36/2016 SICONV 831541/2016	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS COMUNITÁRIAS	Ministério da Cidadania	243.750,00	488,48	244.238,48	Academias no Mutambo e Preventório entregues. Academia do bairro Primavera aguardando seguro para contratação
8	1032366-93/2016 SICONV 831484/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA	Ministério da Cidadania	975.000,00	1.953,91	976.953,91	Quadra do Tucumã concluída Quadra Vila Betel em licitação (em análise de recurso administrativo).
9	1032343-06/2016 SICONV 835754/2016	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS COMUNITÁRIAS	Ministério da Cidadania	354.276,98	709,97	354.986,95	Duas academias concluídas. Academia Bairro Waldemar Maciel em contratação Academia Bairro Areal - aguardando aceite da licitação pela GIGOV para início de obra.
10	1038197-65/2017 SICONV 843792/2017	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Cidadania	438.750,00	1.172,34	439.922,34	Licitação. Prazo suspenso para atendimento de solicitações de esclarecimento
11	1044284-87/2017 SICONV 846791	PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DA PIÇARREIRA NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.000.000,00	2.004,01	1.002.004,01	Em execução
12	1044286-38/2017 SICONV 846788	PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO MACARRÃO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	750.000,00	1.503,01	751.503,01	Em execução
13	1044344-65/2017 SICONV 846790	PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL JARBAS PASSARINHO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.000.000,00	2.004,01	1.002.004,01	Em execução



14	1047816-24/2017 SICONV 859685	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL CHICO MENDES NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC	MTUR	2.071.901,33	4.153,00	2.076.054,33	Em rescisão. Planilha de serviços remanescentes em elaboração para realização de nova licitação.
15	1046534-21 SICONV 853135	MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	MDS	500.000,00	1.000,00	501.000,00	Em execução
16	874254 1057927-05	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO E DE LAZER	Ministério da Cidadania	603.809,52	115.574,48	719.384,00	Licitação concluída. Em contratação
17	875387 1058876-20	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Cidadania	968.629,34	2.100,00	970.729,34	Licitação concluída em análise GIGOV.
18	874255 1058258-10	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER	Ministério da Cidadania	222.857,14	501,00	223.358,14	Em licitação
19	881991/2018	Apoio a Infraestrutura Urbana no Município de Rio Branco através do recapeamento de vias	Ministério do Desenvolvimento Regional	911.877,39	1.900,00	913.777,39	Em atendimento de pendências CE 685/2020
20	1059777-34 872791/2018	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Reforma de Unidades de Acolhimento (Maria Tapajós e Sol Nascente)	MDS	224.190,00	R\$ 501,00	224.691,00	Em licitação. Recurso administrativo em análise
21	872786/2018	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (Loteamento Iolanda)	MDS	270.476,19	R\$ 542,04	271.018,23	Processo licitatório concluído. Em contratação (aguardando seguro garantia).
22	885537/2019	Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	764.000,00	3.500,00	767.500,00	Projeto em elaboração na SEINFRA



SEINFRAOFI202500422



23	884456/2019	Obras de Pavimentação de Vias no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	955.000,00	2.000,00	957.000,00	Projeto em elaboração na SEINFRA
24	885425/2019	Ampliação e melhoria do sistema de drenagem urbana no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	955.000,00	1.914,00	956.914,00	Projeto em elaboração na SEINFRA
25	886616/2019	Modernização de Complexo Esportivo (Praça do Juventus)	Ministério da Cidadania	382.000,00	802,00	382.802,00	Projeto em elaboração na SEINFRA
26	889420/2019	Pavimentação e Recapeamento de Vias	Ministério do Desenvolvimento Regional	3.809.813,97	11.574,00	3.821.387,97	Projeto em elaboração na SEINFRA
27	889457/2019	Obras de CONTENÇÃO de Encostas	Ministério do Desenvolvimento Regional	4.025.944,80	8.100,00	4.034.044,80	Projeto em elaboração na SEINFRA
28	889319/2019	Execução de Obras de Drenagem Subterrânea com Pavimentação Asfáltica no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.986.141,20	4.000,00	1.990.141,20	Projeto em elaboração na SEINFRA
29	889322/2019	Urbanização de Corredores do Transporte Coletivo	Ministério do Desenvolvimento Regional	4.868.742,80	14.156,00	4.882.898,80	Projeto em elaboração na SEINFRA
30	891466/2019	Obras de recapeamento e pavimentação de vias no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	4.054.594,80	8.126,00	4.062.720,80	Projeto em elaboração na SEINFRA
31	893279/2019	Recapeamento de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.910.000,00	4.100,00	1.914.100,00	Projeto em elaboração na SEINFRA
32	888247/2019	Construção de Ponte (Rio Caipora)	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.413.000,00	3.000,00	1.416.000,00	Projeto em elaboração na SEINFRA
33	896737/2019	Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	955.000,00	1.915,00	956.915,00	Projeto em elaboração na SEINFRA



34	897148/2019	Construção de Quadras Poliesportivas e Quadra de Grama sintética	Ministério da Cidadania	1.719.000,00	3.650,00	1.722.650,00	Projeto em elaboração na SEINFRA
35	902091/2020	Construção de Quadra de Futebol com Grama Sintética	Ministério da Cidadania	573.000,00	1.203,00	574.203,00	Projeto em elaboração na SEINFRA
36	906461/2020	Pavimentação de Vias Urbanas Emenda: Flaviano Melo	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.441.714,00	3.007,00	1.444.721,00	Projeto em elaboração na SEINFRA
37	907202/2020	Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	3.912.474,40	7.900,00	3.920.374,40	Projeto em elaboração na SEINFRA
TOTAL CONTRATOS DE REPASSE (R\$)				54.870.743,86	520.735,66	55.391.479,52	

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 19 – Convênios na Gestão atual (2021-2024).

ORDEM	NÚMERO	OBJETO	ÓRGÃO CONCEDENTE	VALOR DO CONVÊNIO R\$			OBSERVAÇÕES
				REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	468/PCN/2016 SICONV 841257/2016	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM	DEFESA	3.783.455,00	7.582,07	3.791.037,07	1. Rua Beija Flor - Concluída 2. Drenagem na Av. Getulio Vargas - definir se a obra será executada
2	184/PCN/2017 SICONV 843053/2017	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas com Meio-Fio, Sarjeta e Drenagem	DEFESA	850.000,00	1.704,00	851.704,00	Em contratação da 2ª colocada



3	311/PCN/2018 SICONV 865239/2018	Construção de Calçadas em vias urbanas pavimentadas	DEFESA	500.000,00	1.002,00	501.002,00	Atualizar orçamento para licitar
4	329/PCN/2018 SICONV 865292/2018	Construção de Terminal de Passageiros	DEFESA	400.000,00	802,00	400.802,00	Licitado, empresa solicitou reajuste para assinatura do contrato
5	867137/2018	Construção de Feira	SUDAM	300.000,00	601,20	300.601,20	
6	883630/2019	Aquisição de Maquinário	SUDAM	1.468.387,00	3.000,00	1.471.387,00	
7	883639/2019	Aquisição de Maquinário	SUDAM	1.600.000,00	3.500,00	1.603.500,00	
8	894655/2019	Patrulha Mecanizada	DEFESA	1.540.500,00	3.500,00	1.544.000,00	
9	883882/2019	Pavimentação de Via	SUDAM	1.200.000,00	50.000,00	1.250.000,00	
10	347/PCN/2019 SICONV 884237/2019	Ampliação da Casa de Cultura de Rio Branco	DEFESA	294.000,00	600,00	294.600,00	
11	414/PCN/2019 SICONV 893617/2019	Construção de Praça Pública	DEFESA	869.500,00	1.750,00	871.250,00	





12	906338/2020	Ampliação do Terminal Central de Transporte Coletivo e Urbanização da Rua Sergipe no Município de Rio Branco - AC	Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM	7.534.650,00	16.000,00	7.550.650,00	1. Empenhado 2. Proposta/Plano de Trabalho aprovado, aguardando assinatura do convênio
13	897534/2020	Construção de Quadra Esportiva com Grama Sintética	DEFESA	384.000,00	1.000,00	385.000,00	1. Clausula Suspensiva - 30/11/21
14	898369/2020	Construção do Mercado Municipal no Bairro São Francisco	DEFESA	951.586,00	2.000,00	953.586,00	1. Clausula Suspensiva - 30/11/21
15	906095/2020	Aquisição de Equipamentos 01 motoniveladora 01 retroescavadeira	MDR	979.835,00	2.005,00	981.840,00	1. Empenhado 2. Proposta/Plano de Trabalho aprovado, aguardando assinatura do convênio
16	902843/2020	Aquisição de Equipamentos 01 trator de esteiras 01 rolo compactador pé de carneiro	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	955.000,00	10.000,00	965.000,00	1. Empenhado 2. Proposta/Plano de Trabalho aprovado, aguardando assinatura do convênio
17	906075/2020	Aquisição de Maquinário	SUDAM	18.936.434,15	38.677,71	18.975.111,86	
18	906095/2020	Aquisição de Equipamentos	MDR	979.835,00	2.005,00	981.840,00	
TOTAL R\$				43.527.182,15	145.728,98	43.672.911,13	

Fonte: SEINFRA, 2024.



SEINFRAOFI202500422

Quadro 20 - Termos de Compromisso (PAC) na Gestão atual (2021 A 2024)

ORDEM	NÚMERO	OBJETO	ÓRGÃO CONCEDENTE	VALOR DO TERMO DE COMPROMISSO R\$			OBSERVAÇÕES
				REPASSE (R\$)	CONTRAPAR- TIDA (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	352.927-32/2011	Urbanização de Bairros carentes - Bairro Vitória /Chico Mendes - Etapa 1	MCIDADES	15.000.000,00	1.247.447,36	16.247.447,36	Em processo de rescisão e contratação de serviços remanescentes
2	350.955-41/2011	Urbanização da Poligonal Baixada I (Bahia Velha, Glória e Pista) em Rio Branco	MCIDADES	16.169.801,60	276.348,39	16.446.149,99	Unidades habitacionais em execução. Infraestrutura em processo de dipensa para a contratação da EMURB
3	350.956-56/2011	Urbanização da Poligonal Nova Esperança em Rio Branco	MCIDADES	7.117.476,25	165.827,69	7.283.303,94	Unidades habitacionais concluídas; Em processo de encerramento do TC (elaboração de relatório final da obra e solicitação de vistoria final)
4	350.957-60/2011	Urbanização da Poligonal da Vila Acre/Vila Amizade em Rio Branco	MCIDADES	12.206.402,77	2.172.795,76	14.379.198,53	Em execução
TOTAL R\$				50.493.680,62	3.862.419,20	54.356.099,82	

Fonte: SEINFRA, 2024.



SEINFRAOFI202500422



Quadro 21 - Contratos de Financiamento (PAC) na Gestão atual (2021 a 2024).

ORDEM	NÚMERO	OBJETO	ÓRGÃO CONCEDENTE	VALOR DO TERMO DE COMPROMISSO R\$			OBSERVAÇÕES
				REPASSE (R\$)	CONTRAPAR- TIDA (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	346.605-29/2011	Urbanização de Bairros carentes - Bairro Vitória /Chico Mendes - Fase 2	MCIDADES	9.917.558,62	881.850,15	10.799.408,77	
2	408.501-98/2013	PAC Mobilidade Médias Cidades	MCIDADES	51.083.330,06	6.111.676,38	57.195.006,44	
3	412.794-16/2015	PAC Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - 3ª Etapa	MCIDADES	30.528.307,39	1.606.753,02	31.135.060,41	
	TOTAL R\$			91.529.196,07	8.600.279,55	100.129.475,62	

Fonte: SEINFRA, 2024.

Dentre os instrumentos listados nos quadros anteriores, podemos observar que a Gestão 2017-2020, deixou pendente de execução contratos que remontam o ano de 2008, carecendo de intervenção urgente por parte da atual Administração.



V. SITUAÇÃO NA GESTÃO ATUAL

1. Estrutura de Física da Secretaria

Diante das limitações do prédio anterior, que comprometiam o desempenho da equipe, a nova gestão iniciou uma busca por um espaço mais adequado. Após um estudo detalhado das necessidades da equipe, foi escolhido o prédio localizado na Rua Rui Barbosa, 325, Centro (ao lado da prefeitura). A **nova sede**, com sua estrutura moderna e espaços otimizados, proporciona um ambiente de trabalho mais agradável e produtivo possuindo salas de reunião e auditório equipado. Essa mudança representa um investimento na qualidade de vida dos funcionários e na melhoria da produtividade da equipe, alinhada com o objetivo da gestão de promover um ambiente de trabalho mais33 colaborativo e inovador.

A mudança para a nova sede da SEINFRA foi acompanhada pela **renovação completa do mobiliário**, proporcionando um ambiente de trabalho moderno e funcional. O mobiliário antigo, além de apresentar sinais de desgaste, não atendia mais às necessidades da equipe, comprometendo a eficiência e o bem-estar dos colaboradores. A escolha dos novos móveis foi realizada com base em um estudo detalhado das necessidades da equipe, priorizando a ergonomia, a durabilidade e o design. Com essa iniciativa, a gestão demonstra seu compromisso em oferecer um ambiente de trabalho de excelência, que valoriza a saúde e o bem-estar dos colaboradores e impulsiona a produtividade da equipe.

Com a nova Sede, foi possível a criação da **Sala do Empreendedor**, que, em parceria com o SEBRAE, representa um marco importante para o desenvolvimento econômico de Rio Branco. Esse espaço exclusivo oferece aos micro e pequenos empreendedores uma gama completa de serviços, desde orientações personalizadas sobre formalização e gestão empresarial até capacitações em áreas como marketing digital e finanças. Ao simplificar os processos burocráticos e conectar os empreendedores a parceiros estratégicos, a Sala do Empreendedor contribui para o fortalecimento dos pequenos negócios, gerando mais empregos e movimentando a economia local. Essa iniciativa demonstra o compromisso da gestão em fomentar o empreendedorismo e promover o desenvolvimento econômico sustentável.



2. Estrutura Organizacional da Secretaria.

O Decreto Municipal nº 103/2024 publicado em 30 de janeiro 2024 estabeleceu a estrutura organizacional da SEINFRA, definindo as atribuições e responsabilidades de cada setor de forma a garantir a eficiência e a eficácia das ações da Secretaria. Essa organização, composta por oito diretorias além dos gabinetes do Secretário e Secretário Adjunto, está alinhada com a missão da SEINFRA de promover o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população. A estrutura é dinâmica e flexível, permitindo ajustes conforme as necessidades da Secretaria e as mudanças do cenário. A participação dos servidores na elaboração da estrutura garantiu que as demandas dos profissionais fossem consideradas, contribuindo para um ambiente de trabalho mais colaborativo e produtivo. A adequação contínua dessa organização é essencial para que a SEINFRA possa responder de forma ágil e eficaz às demandas da sociedade e alcançar seus objetivos estratégicos.

Atualmente a SEINFRA possui a seguinte estrutura organizacional:

I – Secretário

- a) Chefia de Gabinete;
- b) Assessoria Jurídica;
- c) Unidade de Controle Interno;
- d) Divisão de Recepção e Protocolo;
- e) Assessoria de Mediação Social;

II – Secretário Adjunto

III – Diretoria Executiva

- a) Gerência Plataforma BIM;
- b) Divisão de Planejamento Urbano;

IV – Diretoria de Gestão Administrativa

- a) Divisão de Gestão de Pessoas;
- b) Divisão de Material e Patrimônio;
- c) Divisão de Zeladoria e Transporte;
- d) Divisão de Compras e Licitações;
- e) Divisão de Gestão de Contratos;
- f) Divisão de Suporte, Tecnologia da Informação;
- g) Divisão de Execução Orçamentária e Financeira;
- h) Divisão de Contabilidade;

V – Diretoria de Planejamento

- a) Divisão de Acompanhamento de Metas e Indicadores;
- b) Divisão de Convênios;



VI – Diretoria de Projetos

- a) Divisão de Arquitetura e Urbanismo;
- b) Divisão de Projetos de Engenharia e Edificações;
- c) Divisão de Projetos de Infraestrutura;
- d) Divisão de Orçamento e Custos
- e) Divisão de Topografia;

VII– Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas

- a) Divisão de Fiscalização de Obras Cíveis;
- b) Divisão de Fiscalização de Obras de Infraestrutura;
- c) Divisão de Fiscalização de Manutenção e Conservação Emergencial;

VIII – Diretoria de Regularização Fundiária

- a) Divisão de Titulação Definitiva;
- b) Divisão de Projetos de Regularização Fundiária;
- c) Divisão de Avaliação Imobiliária e Articulação Comunitária;

IX – Diretoria de Licenciamento e Aprovação de Projetos

- a) Divisão de Licenciamento de Obras;
- b) Divisão de Licenciamento de Loteamentos;
- c) Divisão de Licenciamento de Atividades Econômicas;

X – Diretoria de Habitação de Interesse Social

- a) Divisão de Engenharia Pública;
- b) Divisão de Programas e Projetos Habitacionais;
- c) Divisão de Acompanhamento Social;

XI – Diretoria de Fiscalização Urbanística

- a) Divisão de Fiscalização e Controle de Espaço Urbano;
 - 1. Núcleo de Fiscalização de Obras e Posturas;
 - 2. Núcleo de Fiscalização de Ocupações Espontâneas;
 - 3. Núcleo de Fiscalização Atividades Econômicas;
- b) Divisão de Gestão de Atividades Fiscais;

XII – Comissões e Conselhos Vinculados

- a) Comissão de Recursos Fiscais I;
- b) Comissão de Recursos Fiscais II;
- c) Conselho Municipal de Urbanismo;



- d) Conselho de Desenvolvimento da Cidade - CMU ;
- e) Conselho Municipal de Habitação – CMH;

XIII – Autarquia Vinculada

- a) Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS;

XIV – Empresa Pública Vinculada

- a) Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB.

XV – Fundo Vinculado

- a) Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;

2.1 Diretoria de Gestão Administrativa

A Diretoria de Gestão Administrativa da SEINFRA desempenha um papel fundamental na otimização dos processos e na garantia da eficiência da Secretaria. Ao concentrar a gestão de recursos humanos, financeiros, materiais e patrimônio, a Diretoria proporciona o suporte necessário para que as demais áreas possam se dedicar integralmente às suas atividades fim. A gestão de pessoas, com foco no desenvolvimento profissional e na valorização dos servidores, contribui para a melhoria contínua dos serviços prestados à população. A gestão de contratos, compras e licitações, por sua vez, garante a transparência e a legalidade nos processos de aquisição de bens e serviços, otimizando os recursos públicos. A contabilidade e a execução orçamentária e financeira asseguram a correta aplicação dos recursos e a geração de informações precisas para a tomada de decisão. A Diretoria de Gestão também desempenha um papel importante na implementação de novas tecnologias e na busca por soluções inovadoras para os desafios da gestão pública, contribuindo para a modernização da SEINFRA e para a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

2.1.1 Organograma

Figura 5 – Organograma da Diretoria de Gestão Administrativa



Fonte: SEINFRA, 2024.



2.1.2 Atividades Realizadas na Gestão 2021 a 2024.

2.1.2.1 Recursos humanos

Diante da crescente demanda por serviços de infraestrutura no município de Rio Branco, e considerando a complexidade e o volume de projetos sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), constatou-se a necessidade urgente de fortalecer o quadro de pessoal. A subdimensionada equipe da Secretaria impedia o acompanhamento eficiente das diversas etapas dos projetos, desde o planejamento até a execução e fiscalização.

Visando otimizar a gestão e garantir a qualidade dos serviços prestados à população, a SEINFRA deu início a um processo seletivo para a contratação de novos profissionais. Como resultado, foram convocados 20 engenheiros civis, 02 engenheiros elétricos, 16 arquitetos, 02 topógrafos, 01 tecnólogo e 09 auxiliares de topografia e/ou administrativos.

Com a incorporação desses novos colaboradores, o quadro de pessoal da SEINFRA passou a contar com 196 servidores, incluindo cargos comissionados, efetivos e provisórios. Além disso, a Secretaria conta com o apoio de 190 colaboradores terceirizados, totalizando 386 servidores dedicados à realização das atividades da pasta.

No entanto, é importante destacar que os contratos dos servidores admitidos por meio do processo seletivo têm vigência até o ano de 2025. Diante desse cenário, torna-se imprescindível que a administração municipal adote medidas para garantir a continuidade das ações da SEINFRA. Nesse sentido, sugere-se a abertura de um novo concurso público para o provimento efetivo das vagas, assegurando assim a estabilidade dos profissionais e a perenidade dos serviços prestados à população. resumir o quadro de pessoal atual da SEINFRA da seguinte relação:

Quadro 22 - Quadro de pessoal da SEINFRA

DESCRIÇÃO	QUANT.
Secretário	1
Secretário Adjunto	1
Servidores efetivos	81
Servidores provisórios	50
Cargos em comissão	63
Colaboradores terceirizados	190
TOTAL	386

Fonte: SEINFRA, 2024

2.1.2.2 Compras e licitações

A Divisão de Compras e Licitações desempenha um papel crucial na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), atuando como um verdadeiro o motor que impulsiona o desenvolvimento da cidade. Através de um




trabalho metódico e estratégico, essa divisão garante a aquisição de materiais, equipamentos, serviços e a construção de obra públicas de forma transparente, eficiente e econômica, contribuindo significativamente para o sucesso de todas as iniciativas da SEINFRA.

Ao longo da gestão 2021-2024, a Divisão de Compras e Licitações conduziu com sucesso 251 processos licitatórios, abrangendo uma variedade de modalidades. É importante destacar que a SEINFRA foi pioneira na adoção da Lei nº 14.133/2021, implementando-a em 2023. Essa nova legislação, mais moderna e ágil, permitiu otimizar os processos licitatórios, resultando em maior eficiência e economia para o município, além de garantir que a população tenha acesso mais rápido aos benefícios dos equipamentos públicos contruídos com recursos públicos.

2.1.2.3 Contratos

A SEINFRA, nos últimos quatro anos, celebrou um total de 329 contratos, abrangendo diversas áreas de atuação.

Figura 6 – Quantidade de contratos realizados durante a Gestão 2021-2024

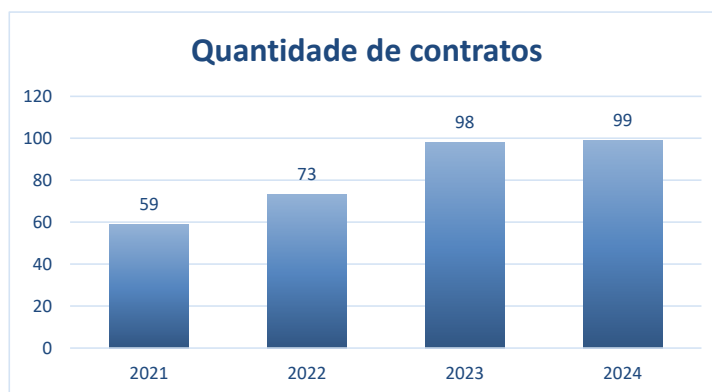

Fonte: SEINFRA, 2024.

Todos os contratos são minuciosamente registrados e gerenciados no sistema RBWeb, sob a responsabilidade de gestores devidamente portariados. Essa gestão rigorosa garante a execução eficiente de cada contrato, desde a construção de grandes obras até a aquisição de materiais de consumo para o dia a dia da Secretaria.

2.1.2.4 Tecnologia da Informação

Com o objetivo de modernizar seus processos e garantir a entrega de serviços de qualidade, a SEINFRA implementou uma série de **soluções tecnológicas**, garantidas em razão da aquisição de 57 licenças da plataforma BIM (AEC Autodesk), licença para o software de orçamento Orçafácil e a ferramenta de gestão de obras Obras.gov que representam um investimento significativo em tecnologia da informação.

Essa atualização tecnológica veio acompanhada de treinamentos para os servidores e proporcionou à gestão da SEINFRA maior eficiência, precisão e controle em todas as etapas dos projetos, desde o planejamento até a execução. A integração entre as



diferentes ferramentas tem permitido um fluxo de informações mais eficiente e a eliminação de retrabalhos, otimizando os processos internos e garantindo a conformidade com as normas técnicas e legais vigentes, além de evitar possíveis processos jurídicos relacionados à utilização irregular de softwares.

2.2 Diretoria de Planejamento

A Diretoria de Planejamento desempenha um papel estratégico na SEINFRA, sendo responsável por definir as diretrizes e metas que nortearão as ações da Secretaria. Por meio do controle do orçamento e do monitoramento dos indicadores de desempenho, a Diretoria garante a aplicação eficiente e eficaz dos recursos, assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA e Plano de Governo).

O acompanhamento da execução de contratos de repasse, convênios, termos de compromisso e contratos de financiamento é fundamental para garantir a transparência e a accountability das ações e resultados entregues pela SEINFRA, além de permitir a identificação de eventuais desvios e a tomada de medidas corretivas.

A integração entre o planejamento e a execução é crucial para o sucesso das ações e a otimização dos resultados. A Diretoria de Planejamento, portanto, fornece a visão estratégica necessária para a tomada de decisões e garante a sustentabilidade das ações da SEINFRA.

2.2.1 Organograma

Figura 7 – Organograma da Diretoria de Planejamento



Fonte: SEINFRA, 2024.

2.2.2 Atividades Realizadas na Gestão 2021 a 2024

Durante a gestão 2021 a 2024, a diretoria tem realizado o acompanhamento das metas e indicadores além da elaboração de relatórios de gestão e acompanhamentos trimestrais e anuais, sempre buscando o cumprimento das metas e ações previstas no PPA e Plano de Governo.

A Diretoria de Planejamento acompanhou, na gestão atual, a execução de um total de 119 instrumentos financeiros, incluindo 51 contratos de repasse, 61 convênios, 4 termos de compromisso e 3 instrumentos de financiamento.



Quadro 23 – Instrumentos Financeiros em acompanhamento

Tipo de Instrumento	Gestão Anterior	Gestão Atual	Total	Valor Total (R\$)
Contratos de Repasse	37	14	51	116.490.774,94
Convênios	18	43	61	150.927.129,13
Termos de Compromisso	4	0	4	54.356.099,82
Instrumentos de Financiamento	3	0	3	100.129.475,62
TOTAL	62	57	119	421.903.479,51

Fonte: SEINFRA, 2024.

Dos 37 contratos de repasse herdados, 24 foram encerrados, estando 18 com prestação de contas aprovada, 3 com prestação de contas em análise e 3 rescindidos por inviabilidade do empreendimento.

Quanto aos 18 (dezoito) convênios deixados pela gestão anterior, 9 foram finalizados na atual gestão, estando 6 com prestação de contas aprovada, 2 com prestação de contas em análise e 01 rescindido em razão do não cumprimento da cláusula suspensiva.

Entre 2021 a 2024, a SEINFRA recebeu 57 novos contratos de repasse e/ou convênios totalizando R\$ 168.254.218,00 (cento e sessenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e dezoito reais) em investimentos. Esses recursos foram destinados para a realização de obras e ações que **impulsionam o desenvolvimento da cidade**, gerando emprego e renda, e promovendo a inclusão social e o bem-estar da população.



Quadro 24 - Contratos de Repasse 2021-2024

ORDEM	NÚMERO	OBJETO	ÓRGÃO CONCEDENTE	VALOR DO CONTRATO DE REPASSE R\$			OBSERVAÇÕES
				REPASSE (R\$)	CONTRAPAR- TIDA (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	265.393-43/2008	URBANIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - BAIRRO DA PAZ	Ministério do Desenvolvimento Regional	2.965.600,00	156.084,22	3.121.684,22	Finalizado. Prestação de Contas em análise
2	1009827-92/2013 SICONV 789198/2013	REVITALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CALÇADÃO DA ORLA DO RIO ACRE ACRE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	MTUR	2.925.000,00	121.875,00	3.046.875,00	Licitado, aguardando OS
3	1017808-96/2014 SICONV 805543/2014	REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.482.100,00	2.978,13	1.485.078,13	Em execução
4	1015477-39/2014 SICONV 809413/2014	READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CORREDORES DO TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.482.100,00	21.227,03	1.503.327,03	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
5	1026338-21/2015 SICONV 824255/2015	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Cidadania	292.500,00	586,17	293.086,17	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
6	1027701-48/2015 SICONV 825344/2015	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL AZIZ ABUCATER	MTUR	1.462.500,00	2.930,86	1.465.430,86	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada





7	1032354-36/2016 SICONV 831541/2016	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS COMUNITÁRIAS	Ministério da Cidadania	243.750,00	488,48	244.238,48	Finalizado. Prestação de Aprovada Contas
8	1032366-93/2016 SICONV 831484/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA	Ministério da Cidadania	975.000,00	1.953,91	976.953,91	Finalizado. Prestação de Aprovada Contas
9	1032343-06/2016 SICONV 835754/2016	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS COMUNITÁRIAS	Ministério da Cidadania	354.276,98	709,97	354.986,95	Finalizado. Prestação de Aprovada Contas
10	1038197-65/2017 SICONV 843792/2017	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Cidadania	438.750,00	1.172,34	439.922,34	Em licitação
11	1044284-87/2017 SICONV 846791	PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DA PIÇARREIRA NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.000.000,00	2.004,01	1.002.004,01	Finalizado. Prestação de Aprovada Contas
12	1044286-38/2017 SICONV 846788	PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO MACARRÃO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	750.000,00	1.503,01	751.503,01	Finalizado. Prestação de Aprovada Contas
13	1044344-65/2017 SICONV 846790	PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL JARBAS PASSARINHO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.000.000,00	2.004,01	1.002.004,01	Finalizado. Prestação de Aprovada Contas
14	1047816-24/2017 SICONV 859685	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL CHICO MENDES NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC	MTUR	2.071.901,33	4.153,00	2.076.054,33	Finalizado. Prestação de Aprovada Contas
15	1046534-21 SICONV 853135	MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	MDS	500.000,00	1.000,00	501.000,00	Finalizado. Prestação de Aprovada Contas





16	874254 1057927-05	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO E DE LAZER	Ministério da Cidadania	603.809,52	115.574,48	719.384,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
17	875387 1058876-20	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Cidadania	968.629,34	2.100,00	970.729,34	Em execução
18	874255 1058258-10	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER	Ministério da Cidadania	222.857,14	501,00	223.358,14	Em execução
19	881991/2018	Apoio a Infraestrutura Urbana no Município de Rio Branco através do recapeamento de vias	Ministério do Desenvolvimento Regional	911.877,39	1.900,00	913.777,39	Instrumento Rescindido
20	1059777-34 872791/2018	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Reforma de Unidades de Acolhimento (Maria Tapajós e Sol Nascente)	MDS	224.190,00	R\$ 501,00	224.691,00	Instrumento Rescindido
21	872786/2018	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (Loteamento Iolanda)	MDS	270.476,19	R\$ 542,04	271.018,23	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
22	885537/2019	Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	764.000,00	3.500,00	767.500,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
23	884456/2019	Obras de Pavimentação de Vias no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	955.000,00	2.000,00	957.000,00	Finalizado. Prestação de Contas em análise
24	885425/2019	Ampliação e melhoria do sistema de drenagem urbana no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	955.000,00	1.914,00	956.914,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
25	886616/2019	Modernização de Complexo Esportivo (Praça do Juventus)	Ministério da Cidadania	382.000,00	802,00	382.802,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.





26	889420/2019	Pavimentação e Recapeamento de Vias	Ministério do Desenvolvimento Regional	3.809.813,97	11.574,00	3.821.387,97	Em execução
27	889457/2019	Obras de CONTENÇÃO de Encostas	Ministério do Desenvolvimento Regional	4.025.944,80	8.100,00	4.034.044,80	Prazo da cláusula suspensiva expirado
28	889319/2019	Execução de Obras de Drenagem Subterrânea com Pavimentação Asfáltica no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.986.141,20	4.000,00	1.990.141,20	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
29	889322/2019	Urbanização de Corredores do Transporte Coletivo	Ministério do Desenvolvimento Regional	4.868.742,80	14.156,00	4.882.898,80	Em execução
30	891466/2019	Obras de recapeamento e pavimentação de vias no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	4.054.594,80	8.126,00	4.062.720,80	Em execução
31	893279/2019	Recapeamento de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.910.000,00	4.100,00	1.914.100,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
32	888247/2019	Construção de Ponte (Rio Caipora)	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.413.000,00	3.000,00	1.416.000,00	Em execução
33	896737/2019	Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	955.000,00	1.915,00	956.915,00	Em execução
34	897148/2019	Construção de Quadras Poliesportivas e Quadra de Grama sintética	Ministério da Cidadania	1.719.000,00	3.650,00	1.722.650,00	Em execução
35	902091/2020	Construção de Quadra de Futebol com Grama Sintética	Ministério da Cidadania	573.000,00	1.203,00	574.203,00	Finalizado. Prestação de Contas em análise





36	906461/2020	Pavimentação de Vias Urbanas Emenda: Flaviano Melo	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.441.714,00	3.007,00	1.444.721,00	Licitado
37	907202/2020	Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	3.912.474,40	7.900,00	3.920.374,40	Projeto em elaboração na SEINFRA
38	924271/2021	Construção de Quadras Poliesportivas	Ministério da Cidadania	1.910.000,00	4.500,00	1.914.500,00	Em licitação
39	915354/2021	Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	3.335.177,00	6.700,00	3.341.877,00	Em execução
40	914723/2021	Pavimentação de Estradas Vicinas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.795.432,00	371.970,43	2.167.402,43	Em execução
41	914722/2021	Pavimentação e Adequação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	7.760.484,00	844.516,00	8.605.000,00	Em execução
42	915281/2021	Construção de Quadra Poliesportiva	Ministério da Cidadania	534.792,36	1.200,00	535.992,36	Licitado, aguardando crédito de recursos para emissão de AIO
43	914728/2021	Construção de Ponte Local: Estrada Jarbas Passarinho sobre o Igarapé Redenção	Ministério do Desenvolvimento Regional	2.849.720,00	761.844,97	3.611.564,97	Em execução
44	917930/2021	Reforma de Quadras de Grama Sintética	Ministério da Cidadania	955.000,00	2.005,00	957.005,00	Em execução
45	916052/2021	Ampliação de Quadra de Esporte (Cobertura quadra de grama sintética bairro Nova Estação)	Ministério da Cidadania	238.750,00	45.328,00	284.078,00	Licitado, aguardando crédito de recursos para emissão de AIO
46	924829/2021	Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	2.870.210,00	6.500,00	2.876.710,00	Não iniciada



47	916908/2021	Recapeamento de Vias Urbanas na cidade de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	3.728.926,00	334.074,00	4.063.000,00	Em andamento
48	916909/2021	Implantação de Viaduto na cidade de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	25.000.000,00	51.000,00	25.051.000,00	Em andamento
49	917969/2021	Construção de CRAS (Santa Helena)	Ministério da Cidadania	1.241.500,00	2.606,00	1.244.106,00	Licitado, aguardando crédito de recursos para emissão de AIO
50	943842/2023	Pavimentação Asfáltica de Estrada Vicinal	Ministério do Desenvolvimento Regional	4.785.919,00	9.592,00	4.795.511,00	Em licitação
51	963007/2024	Reforma de quadras esportivas no município de rio branco/ac (Baixada)	MESP	1.648.096,66	3.452,00	1.651.548,66	Projeto em aprovação
TOTAL CONTRATOS DE REPASSE (R\$)				113.524.750,88	2.966.024,06	116.490.774,94	

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 25 - Convênios 2021-2024

ORDEM	NÚMERO	OBJETO	ÓRGÃO CONCEDENTE	VALOR DO CONVÊNIO R\$			OBSERVAÇÕES
				REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	468/PCN/2016 SICONV 841257/2016	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM	DEFESA	3.783.455,00	7.582,07	3.791.037,07	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
2	184/PCN/2017 SICONV 843053/2017	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas com Meio-Fio, Sarjeta e Drenagem	DEFESA	850.000,00	1.704,00	851.704,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.





3	311/PCN/2018 SICONV 865239/2018	Construção de Calçadas em vias urbanas pavimentadas	DEFESA	500.000,00	127.449,00	627.449,00	Paralisada
4	329/PCN/2018 SICONV 865292/2018	Construção de Terminal de Passageiros	DEFESA	400.000,00	258.052,00	658.052,00	Finalizado. Prestação de Contas em análise
5	867137/2018	Construção de Feira	SUDAM	300.000,00	601,20	300.601,20	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
6	883630/2019	Aquisição de Maquinário	SUDAM	1.468.387,00	771.613,00	1.925.000,00	Finalizado. Prestação de Contas em análise
7	883639/2019	Aquisição de Maquinário	SUDAM	1.600.000,00	3.500,00	1.603.500,00	
8	894655/2019	Patrulha Mecanizada	DEFESA	1.540.500,00	387.650,00	1.928.150,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
9	883882/2019	Pavimentação de Via	SUDAM	1.200.000,00	795.000,00	1.995.000,00	Não iniciada
10	347/PCN/2019 SICONV 884237/2019	Ampliação da Casa de Cultura de Rio Branco	DEFESA	294.000,00	155.97,00	449.970,00	Em execução
11	414/PCN/2019 SICONV 893617/2019	Construção de Praça Pública	DEFESA	869.500,00	1.750,00	871.250,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
12	906338/2020	Ampliação do Terminal Central de Transporte Coletivo e Urbanização da Rua Sergipe no Município de Rio Branco - AC	Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM	7.534.650,00	16.000,00	7.550.650,00	Projeto rejeitado





13	897534/2020	Construção de Quadra Esportiva com Grama Sintética	DEFESA	384.000,00	197.520,00	581.520,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
14	898369/2020	Construção do Mercado Municipal no Bairro São Francisco	DEFESA	951.586,00	434.877,00	1.386.463,00	Em execução
15	902843/2020	Aquisição de Equipamentos	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	955.000,00	293.850,00	1.248.850,00	Em execução
16	906075/2020	Aquisição de Maquinário	SUDAM	18.936.434,15	157.237,71	19.003.108,15	Em execução
17	906095/2020	Aquisição de Equipamentos	MDR	979.835,00	2.005,00	981.840,00	Em execução
18	910110/2021	Aquisição de Equipamentos de Construção	DEFESA	1.640.000,00	3.400,00	1.643.400,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
19	909919/2021	Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Rio Branco	DEFESA	480.000,00	54.423,00	534.423,00	Em execução
20	917533/2021	Construção de Mercado	DEFESA	19.990.000,00	9.038.499,00	29.028.499,00	Em execução
21	918092/2021	Construção de Praça com contenção de encosta	DEFESA	5.010.000,00	1.042.251,00	6.052.251,00	Em execução
22	918182/2021	Construção de Casa de Apoio e Acolhimento	DEFESA	3.485.000,00	7.000,00	3.492.000,00	Em licitação
23	921965/2021	Construção de Centros de Convivência do Idoso	DEFESA	4.200.000,00	9.500,00	4.209.500,00	Em licitação
32	933760/2022	Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas (Acesso a Casa de Passagem)	DEFESA	2.880.000,00	5.772,00	2.885.772,00	Em licitação





33	933762/2022	Pavimentação em vias urbanas com Drenagem e calçadas (Rua Sabia e Acamaro)	DEFESA	1.920.000,00	3.848,00	1.923.848,00	Em licitação
34	929482/2022	Construção de Ponte sobre o Igarapé Judia.	DEFESA	3.840.000,00	R\$ 3.589.731,00	7.429.731,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
35	929598/2022	Requalificação do Calçadão da Rua Quintino Bocaiuva	DEFESA	1.344.000,00	R\$ 2.694,00	1.346.694,00	Em suspensiva
36	929474/2022	Construção da cobertura da quadra de grama sintética Dep. Alan Rick	DEFESA	624.000,00	R\$ 1.251,00	625.251,00	Licitada, aguardando repasse para emissão de AIO
38	938195/2022	Construção de Ginásio Poliesportivo no Município de Rio Branco (Calafate)	Ministério da Defesa	2.000.000,00	4.010,00	2.004.010,00	Licitada, aguardando repasse para emissão de AIO
39	940858/2023	Pavimentação Asfáltica de Estrada Vicinal com Drenagem no Município de Rio Branco (Ramal do Garapeiro)	Ministério da Defesa	3.128.079,00	6.269,00	3.134.348,00	Licitado
40	941989/2023	Construção de Centro Comunitário (Lot. Santa Cruz)	Ministério da Defesa	536.000,00	4.000,00	540.000,00	Convênio anulado
41	941427/2023	Construção de quadra poliesportiva coberta no Município de Rio Branco (Rui Lino III) Ex dep Jéssica Sales	Ministério da Defesa	900.000,00	2.000,00	902.000,00	Em suspensiva
42	941187/2023	Construção de quadra poliesportiva coberta no Município de Rio Branco (Ilson Ribeiro) Ex dep Jéssica Sales	Ministério da Defesa	900.000,00	2.000,00	902.000,00	Em suspensiva
43	941495/2023	Construção de quadra poliesportiva coberta no Município de Rio Branco (Andirá)	Ministério da Defesa	900.000,00	2.000,00	902.000,00	Em suspensiva
44	941144/2023	Construção de quadra poliesportiva coberta no Município de Rio Branco (Valdemar Marciel)	Ministério da Defesa	900.000,00	2.000,00	902.000,00	Em suspensiva
45	941061/2023	Construção de quadra poliesportiva coberta no Município de Rio Branco (Mutambo)	Ministério da Defesa	900.000,00	R\$ 2.000,00	902.000,00	Em suspensiva





46	941534/2023	Construção de quadra poliesportiva coberta no Município de Rio Branco (Cabreúva)	SEINFRA Ministério da Defesa	900.000,00	2.000,00	902.000,00	Em suspensiva
47	941990/2023	Construção de Galpão de entreposto no Município de Rio Branco (Riozinho do Rola) - Sergio Petecão	Ministério da Defesa	997.996,00	2.004,00	1.000.000,00	Em suspensiva
48	941494/2023	Revitalização e ampliação da quadra esportiva do Bela Vista (Cobertura)- Sergio Petecão	Ministério da Defesa	876.247,00	1.800,00	878.047,00	Em suspensiva
49	941428/2023	Revitalização e ampliação da quadra esportiva de grama sintética do Conj. Tangará	Ministério da Defesa	787.335,00	1.578,00	788.913,00	Em suspensiva
50	941843/2023	Revitalização e ampliação da quadra esportiva de grama sintética do João Eduardo (Cobertura)- Sergio Petecão	Ministério da Defesa	698.422,00	1.578,00	700.000,00	Em suspensiva
51	941571/2023	Construção de restaurante popular no Município de Rio Branco- Sergio Petecão	Ministério da Defesa	3.840.000,00	R\$ 7.700,00	3.847.700,00	Em suspensiva
52	941621/2023	Revitalização e ampliação da quadra esportiva de grama sintética do Vila Betel (Cobertura)Flaviano Melo	Ministério da Defesa	768.000,00	1.578,00	769.578,00	Em suspensiva
53	960322/2024	Pavimentação de vias Urbanas (Belo Jardim)	Ministério da Defesa	1.392.960,00	2.972,00	1.395.932,00	Em suspensiva
54	957375/2024	Revitalização de praças no município de Rio Branco/AC (Praça Cidade da Criança, praça dos tocos e Santa Cruz)	Ministério da Defesa	2.880.000,00	5.772,00	2.885.772,00	Em suspensiva
55	964370/2024	2º Etapa da Casa de Passagem	Ministério da Defesa	2.400.000,00	4.810,00	2.404.810,00	Em licitação
56	957218/2024	Construção de Restaurante Popular (Calafate)	Ministério da Defesa	2.304.000,00	4.620,00	2.308.620,00	Em suspensiva
57	959624/2024	Construção de Centro de Apoio Rural no Município de Rio Branco - AC	Ministério da Defesa	1.920.000,00	3.850,00	1.923.850,00	Em suspensiva





58	957391/2024	Construção de Restaurante Popular (Tancredo Neves)	SEINFRA Ministério da Defesa	2.880.000,00	5.772,00	2.885.772,00	Em suspensiva
59	958245/2024	Construção da Sede do Conselho Tutelar	Ministério da Defesa	1.920.000,00	3.850,00	1.923.850,00	Em suspensiva
60	957611/2024	Construção de Restaurante Popular (São Francisco)	Ministério da Defesa	2.880.000,00	5.772,00	2.885.772,00	Em suspensiva
61	961753/2024	Construção do Parque Cidade da Criança	Ministério da Defesa	10.373.075,00	20.800,00	10.393.875,00	Em suspensiva
TOTAL R\$				136.922.296,15	14.004.832,98	150.927.129,13	

Fonte: SEINFRA, 2024.



2.3 Diretoria de Projetos.

A Diretoria de Projetos é responsável pela confecção, coordenação e supervisão de todos os projetos arquitetônicos e de engenharia da SEINFRA incluindo estudo topográfico, desenho, estrutura, e elaboração do orçamento para execução. Todas as propostas de obras que chegam à Secretaria passam pelas seguintes divisões: Divisão de Arquitetura, Divisão de Complementares (projetos complementares incluem controle de incêndio, projetos hidráulicos, elétricos, hidrossanitários, etc.), Divisão de Orçamento, Divisão de Topografia e Divisão de Infraestrutura.

2.3.1 Organograma

Figura 8 – Organograma da Diretoria de Projetos



Fonte: SEINFRA, 2024.

2.3.2 Atividades Realizadas pela Gestão de 2021-2024

Ao longo desta gestão, a Diretoria de Projetos encarou o desafio de elaborar todos os processos licitatórios pertinentes a obras de edificação e infraestrutura em geral, desde o Documento de Formalização da Demanda (DFD), Estudo Técnico Preliminar (ETP) até o Projeto Básico (PB), em conformidade com a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) não somente para a SEINFRA, mas também para SEMSA, SASDH e SEAGRO, considerando que estas secretarias não possuíam técnicos aptos para a elaboração da parte técnica dos processos licitatórios conforme as novas exigências legais.



Quadro 26 – Demandas e Ações Realizadas pela Diretoria de Projetos por Tipologia (2021)

DEMANDANTES	DEMANDAS					
	RECEBIDO		Em Andamento	Concluídos	Arquivados	SUB TOTAL
	2021	Remanescentes (anos anteriores)				
Educação	5	2	5	2	S/R	7
Esporte, Lazer, Cultura e Parques Urbanos	9	5	12	2	S/R	14
Infraestrutura, Urbanização e Mobilidade Urbana	11	3	14	S/R	S/R	14
Interesse Social	15	3	18	S/R	S/R	18
Mercados, Feiras e Centros De Compras	2	1	2	1	S/R	3
Saúde	13	S/R	13	S/R	S/R	13
Sedes Secretarias e Órgãos Públicos	S/R	2	2	S/R	S/R	2
Ministério Público do Acre - MPE AC	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	0
TOTAL =>>>>>>>	55	16	66	5	0	71

Fonte: SEINFRA, 2024.

S/R - Sem registro

Quadro 27 – Demandas e Ações Realizadas pela Diretoria de Projetos por Tipologia (2022)

DEMANDANTES	DEMANDAS					
	RECEBIDO		Em Andamento	Concluídos	Arquivados	SUB TOTAL
	2022	Remanescentes (anos anteriores)				
Educação	14	5	13	6	S/R	19
Esporte, Lazer, Cultura e Parques Urbanos	8	12	19	1	S/R	20
Infraestrutura, Urbanização e Mobilidade Urbana	11	12	21	2	S/R	23
Interesse Social	5	18	20	3	S/R	23
Mercados, Feiras e Centros De Compras	1	2	2	1	S/R	3
Saúde	4	13	15	2	S/R	17
Sedes Secretarias e Órgãos Públicos	10	2	11	1	S/R	12
Ministério Público do Acre - MPE AC	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R
TOTAL =>>>>>>>	53	64	101	16	0	117

Fonte: SEINFRA, 2024.

S/R - Sem registro



Quadro 28 – Demandas e Ações Realizadas pela Diretoria de Projetos por Tipologia (2023)

Demandas e Ações Realizadas pela Diretoria de Projetos por Tipologia						
DEMANDANTES	DEMANDAS					
	RECEBIDO		Em Andamento	Concluídos	Arquivados	SUB TOTAL
	2023	Remanescentes (anos anteriores)				
Educação	92	13	47	58	0	105
Esporte, Lazer, Cultura e Parques Urbanos	54	19	17	56	0	73
Infraestrutura, Urbanização e Mobilidade Urbana	49	21	17	52	1	70
Interesse Social	6	20	10	14	2	26
Mercados, Feiras e Centros De Compras	3	2	2	3	0	5
Saúde	15	16	6	25	0	31
Sedes Secretarias e Órgãos Públicos	20	11	5	26	0	31
Ministério Público do Acre - MPE AC	80	S/R	0	80	0	80
TOTAL =>>>>>>>	135	S/R	0	135	0	135

Fonte: SEINFRA, 2024.

S/R - Sem registro


Quadro 29 – Demandas e Ações Realizadas pela Diretoria de Projetos por Tipologia (2024)

Demandas e Ações Realizadas pela Diretoria de Projetos por Tipologia						
DEMANDANTES	DEMANDAS					
	RECEBIDO		Em Andamento	Concluídos	Arquivados	SUB TOTAL
	2024	Remanescentes (anos anteriores)				
Educação	22	47	41	28	0	69
Esporte, Lazer, Cultura e Parques Urbanos	25	17	9	33	0	42
Infraestrutura, Urbanização e Mobilidade Urbana	31	17	5	42	1	48
Interesse Social	2	10	1	11	0	12
Mercados, Feiras e Centros De Compras	7	2	1	8	0	9
Saúde	30	6	4	32	0	36
Sedes Secretarias e Órgãos Públicos	15	5	1	19	0	20
Ministério Público do Acre - MPE AC	76	0	0	76	0	76
TOTAL =>>>>>>>	128	0	0	128	0	128




Fonte: SEINFRA, 2024.

Figura 9 – Situação das Demandas da Diretoria de Projetos por tipologia (2021)

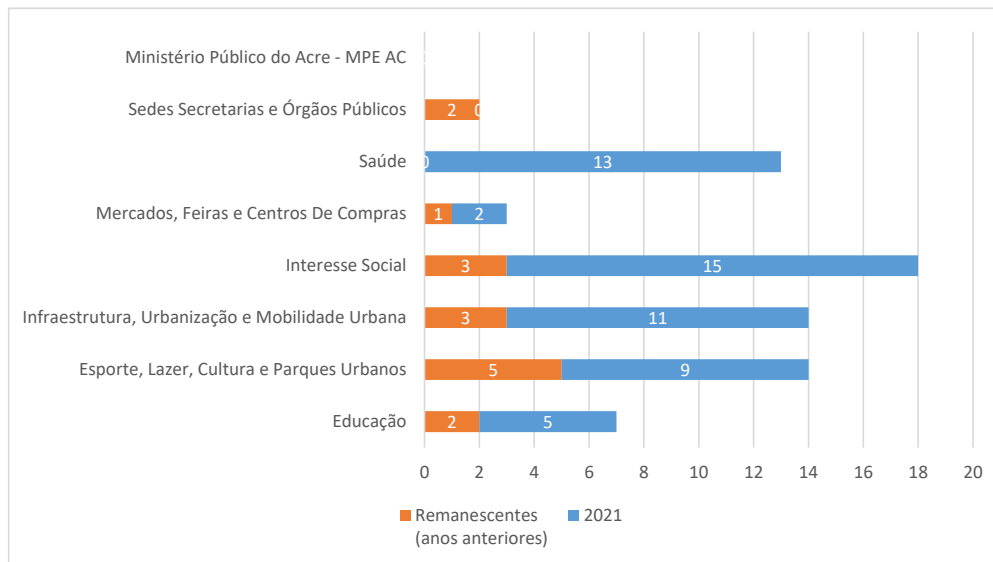

Fonte: SEINFRA, 2024.


Figura 10 – Situação das Ações da Diretoria de Projetos por tipologia (2021)

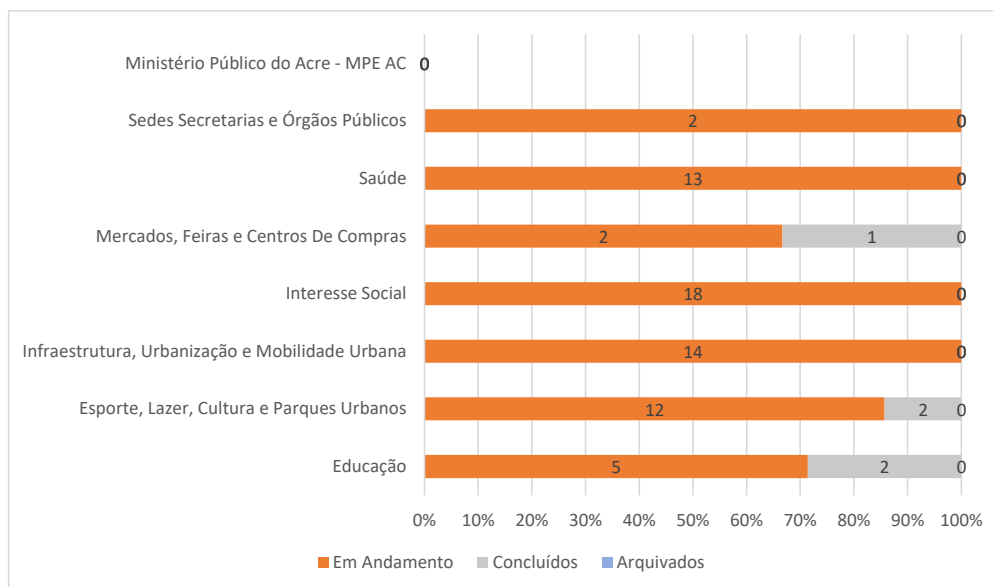

Fonte: SEINFRA, 2024.




Figura 11 – Situação das Demandas da Diretoria de Projetos por tipologia (2022)

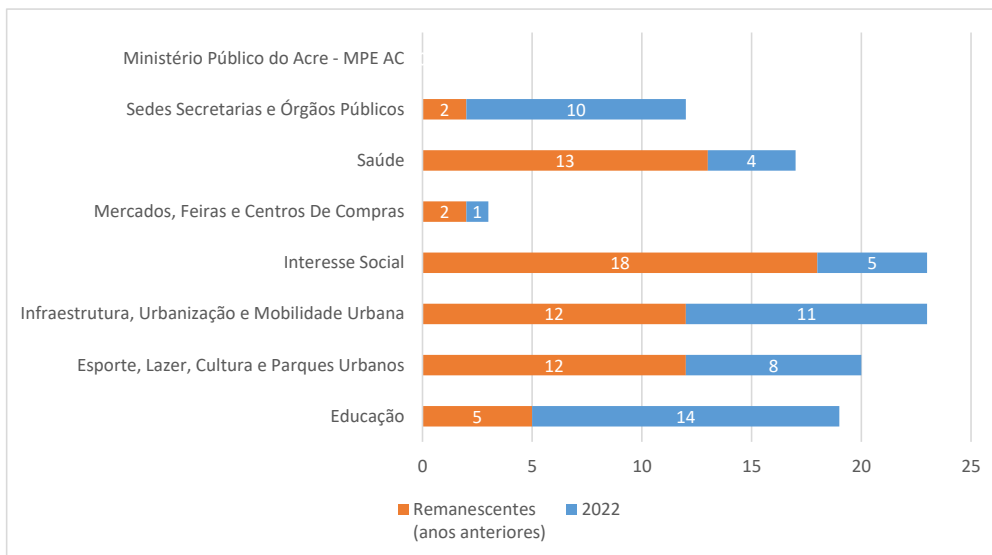

Fonte: SEINFRA, 2024.


Figura 12 – Situação das Ações da Diretoria de Projetos por tipologia (2022)

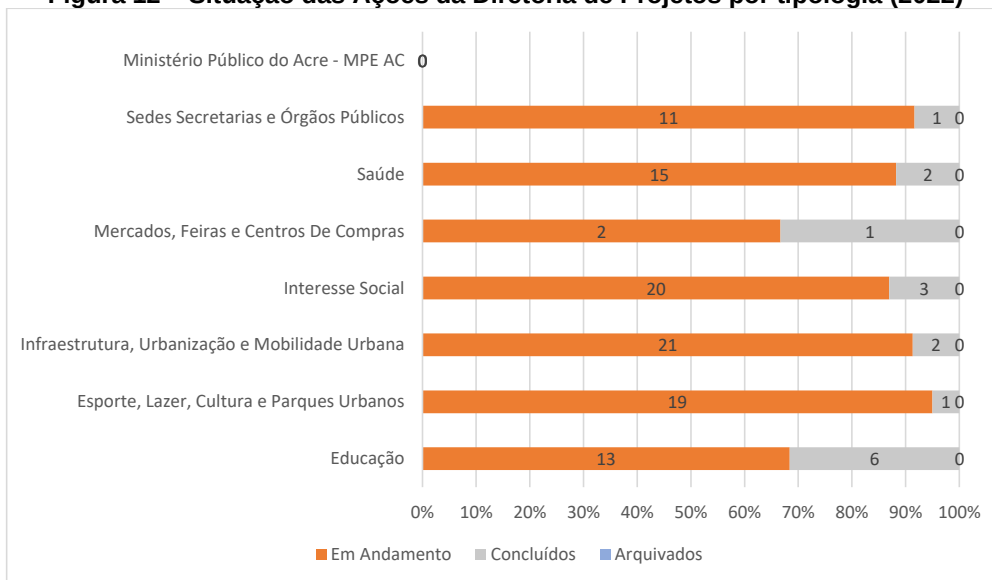

Fonte: SEINFRA, 2024.




Figura 13 – Situação das Demandas da Diretoria de Projetos por tipologia (2023)

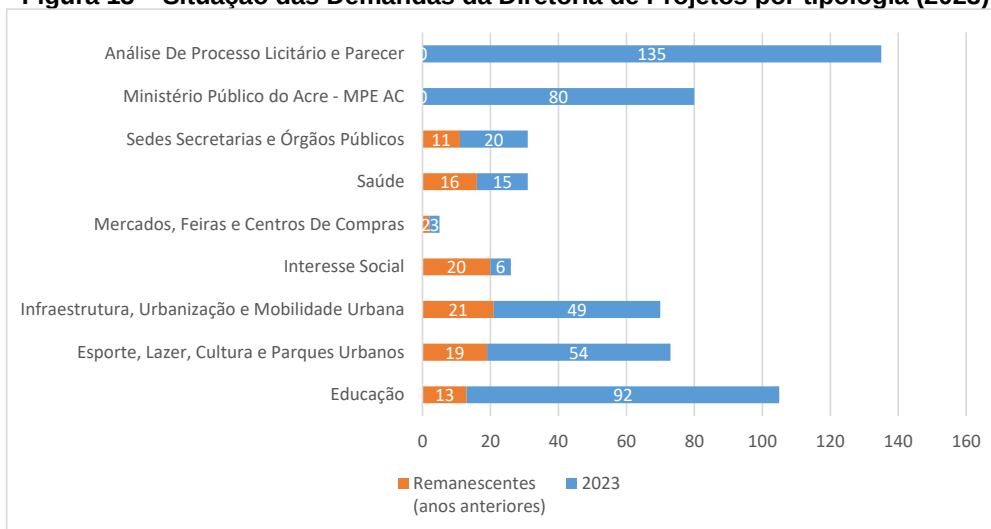

Fonte: SEINFRA, 2024.


Figura 14 – Situação das Ações da Diretoria de Projetos por tipologia (2023)

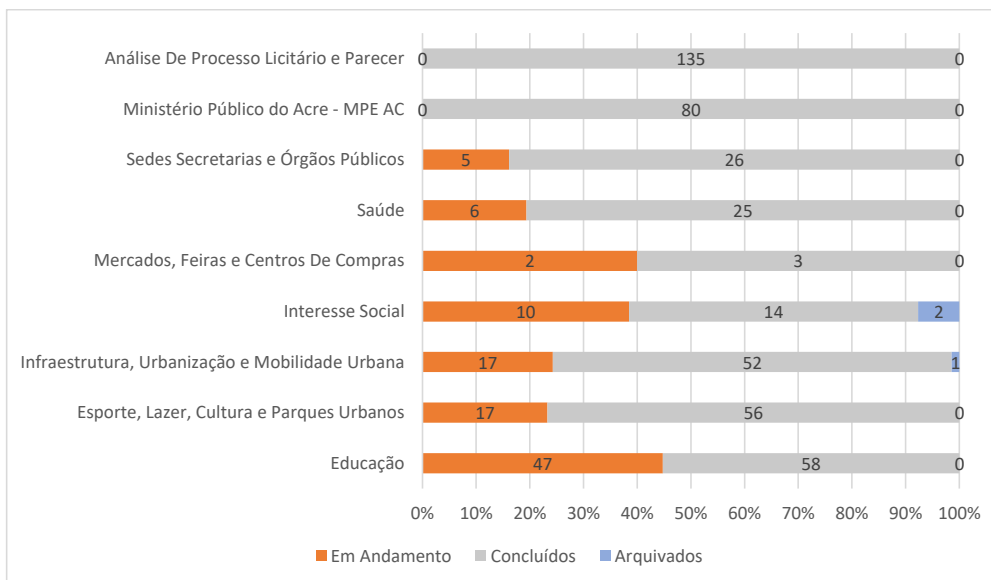

Fonte: SEINFRA, 2024.




Figura 15 – Situação das Demandas da Diretoria de Projetos por finalidade (2024)

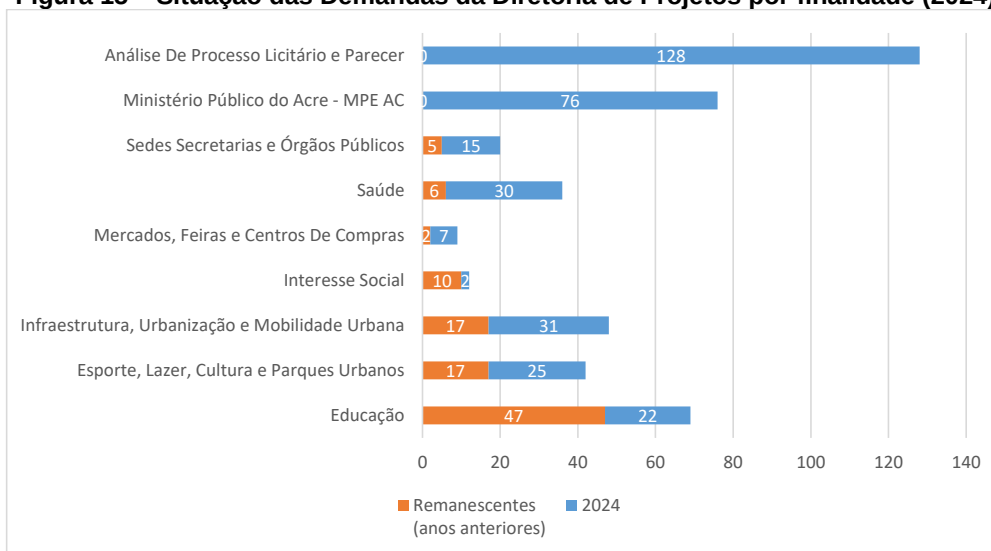

Fonte: SEINFRA, 2024

Figura 16 – Situação das Ações da Diretoria de Projetos por finalidade (2024)

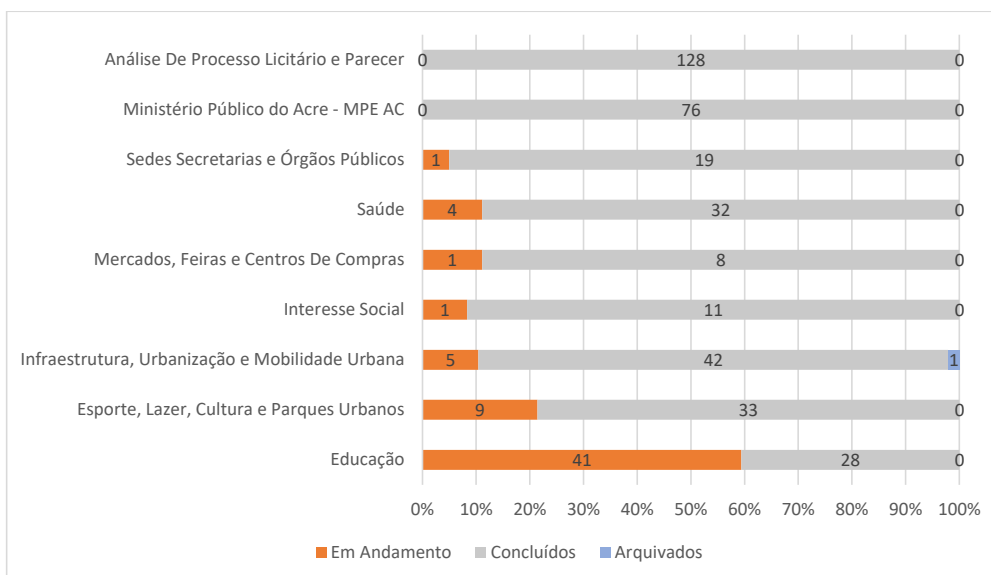

Fonte: SEINFRA, 2024



2.4 Diretoria de Regularização Fundiária

A Diretoria tem como missão garantir a segurança jurídica e o acesso à propriedade para a população, por meio da regularização fundiária. A equipe realiza um trabalho técnico rigoroso, analisando cada processo individualmente para verificar a conformidade com a legislação e a viabilidade da titulação.

Através da análise de documentos, vistorias in loco e pesquisas cadastrais, é garantido que os títulos emitidos sejam seguros e justos.

2.4.1 Organograma

Figura 17 – Organograma da Diretoria de Regularização Fundiária



Fonte: SEINFRA, 2024.

2.4.2 Atividades Realizadas na Gestão 2021 a 2024

Durante a gestão, a Diretoria de Regularização Fundiária desenvolveu as ações contidas no quadro abaixo.

Quadro 30 – Ações realizadas pela Diretoria de Regularização Fundiária

Tipo de Instrumento	2021	2022	2023	2024
Protocolos Recebidos	213	662	695	851
Protocolos Enviados	285	631	1056	1066
Protocolos Arquivados	205	160	83	270
Titulos Definitivos Expedidos	50	97	50	161
Áreas Públicas Regularizadas	03	15	70	0

Fonte: SEINFRA, 2024.

Importa esclarecer que os números apresentados relativos à expedição de títulos definitivos contemplam a emissão de 1ª via, 2ª via e remição de foro.

Em 2023 e 2024, a Diretoria deu continuidade a diversas ações para garantir o acesso à moradia digna e regularizar o território urbano. Entre elas, destacam-se: a abertura de



matrículas, remembramentos e desmembramentos de terrenos para os programas habitacionais; a apresentação de propostas para a regularização fundiária de áreas urbanas ao Ministério das Cidades e à Superintendência do Patrimônio da União; a realização de desapatações de áreas públicas para fins habitacionais; e a entrega de títulos definitivos para mais de 200 famílias. Atualmente, a Diretoria está concentrada na regularização de 1.600 lotes no bairro Benfica, um projeto selecionado pelo Programa Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

2.5 Diretoria de Licenciamento e Aprovação de Projetos

A Diretoria é responsável por analisar e emitir diversos tipos de licenças e autorizações, como Alvarás de Construção, Habite-se, Viabilidade, Desmembramentos e Alvarás de Funcionamento. O objetivo da Diretoria é garantir que todas as construções e atividades sejam realizadas de forma segura e em conformidade com as leis e normas vigentes.

Para facilitar e agilizar os processos, foi implementado em 2023 o Sistema de Alvará Imediato e o Sistema de Viabilidade Empresarial Automática. Essas ferramentas digitais permitem que os cidadãos e empreendedores obtenham as autorizações necessárias de forma mais rápida e eficiente, estimulando o desenvolvimento econômico e facilitando a vida da população.

2.5.1 Organograma

Figura 18 – Organograma da Diretoria de Licenciamento e Aprovação de Projetos



Fonte: SEINFRA, 2024.

2.5.2 Atividades Realizadas na Gestão 2021 a 2024

Na atual gestão a Diretoria realizou a meissão de 4.039 documentos e promoveu a abertura de 14.846 empresas.

Quadro 31 – Ações realizadas pela Diretoria de Licenciamento e Aprovação de Projetos

Tipo	2021	2022	2023	2024
Alvarás para Construção	616	436	405	396
Termo de Habite-se	353	301	287	228
Aprovação de Projeto	80	67	94	69
Certidão de Viabilidade Urbanística	83	84	94	87



Autorizações para Uso de Espaço Público	86	114	160	120
Empresas Abertas	5.260	5.095	4.491	•
Alvarás de Demolição	21	22	15	16

Fonte: SEINFRA, 2024.

- Dado não contabilizado

2.6 Diretoria de Habitação de Interesse Social

Diretoria criada em 2023 (Decreto nº 138 de 06 de janeiro de 2023) para viabilizar a implantação da Política de Habitação de Interesse Social no Município de Rio Branco através dos seguintes programas sociais de habitação:

- ✓ 1.001 Dignidades;
- ✓ Minha Dignidades;
- ✓ Pro Moradia/Engenharia Pública

Programas sociais de fomento a moradia para população de baixa renda em situação de risco ou em vulnerabilidade bem como moradia para servidores públicos municipais através da construção de unidade habitacionais ou prestação de consultoria técnica na elaboração de projetos de arquitetura e isenção de taxas de licenciamento.

2.6.1 Organograma

Figura 19 – Organograma da Diretoria de Habitação de Interesse Social



Fonte: SEINFRA, 2024.

2.6.2 Atividades Realizadas na Gestão 2021 a 2024

2.6.2.1 Ano de 2023

Neste ano foram criados os programas habitacionais através das seguintes Leis:

1. Lei Complementar Nº 272 de 19 de dezembro de 2023 que dispõe sobre o Programa “1001 Dignidades: Unidades Habitacionais de Interesse Social Sustentáveis”.
2. Lei Complementar Nº 273 de 19 de dezembro de 2023 que autoriza a doação, para promoção de habitação, dos bens imóveis, e dá outras providências.



3. Lei Complementar Nº 274 de 19 de dezembro de 2023 que autoriza o executivo municipal a alienar imóvel para fins de instalação e construção de núcleo habitacional vertical, denominado “Programa Minha Dignidade”, através de concorrência pública, e dá outras providências.

No Programa 1.001 Dignidades, foram desenvolvidas as ações de transporte da madeira doada, montagem e funcionamento da estrutura para beneficiamento da madeira e a montagem do primeiro protótipo.

Para implantação do Programa Minha Dignidade foram realizados os cadastramento dos lotes na plataforma do Governo Federal, visita nos lotes junto com a equipe da Caixa Econômica Federal e realizados os estudos de viabilidade nos bairros Juarez Távora e Portal da Amazônia.



Quanto ao Programa PRÓ-MORADIA (PROMORE), foram abertos 04 processos em 2023.

2.6.2.2 Ano de 2024

Ao longo do ano de 2024, foram iniciados 14 processos referentes ao Programa Pro Moradia – PROMORE. No que diz respeito ao Programa 1.001 Dignidades, as seguintes ações foram implementadas.

1. Montagem do Segundo Protótipo da Unidade Habitacional;
2. Contratação de empresa para fornecimento de madeira e serragem;
3. Contratação de empresa para fornecimento de equipamento de marcenaria;
4. Elaboração de processo licitatório para contratação de empresa para executar a terraplanagem nos diversos bairros;
5. Elaboração de processo licitatório para contratação de empresa para executar o Radier nos diversos bairros;
6. Elaboração de processo licitatório para contratação de empresa para fornecimento dos insumos necessários para montagem das Unidades Habitacionais;
7. Elaboração de terraplanagem de 109 lotes no Bairro Santo Afonso.

Já o Programa Minha Dignidade, teve 07 empreendimentos pelo Governo Federal, tendo sido realizado as seguintes ações:

1. Elaboração de Processo de Edital de Chamamento Público para escolha de empresas para elaborar projetos e executar as obras;
2. Encaminhamento das empresas selecionadas para a Caixa Econômica Federal (CEF) para os devidos processo de análises e habilitação para futura contratação junto ao Ministério do Desenvolvimento;



3. Cinco Empreendimentos obtiveram aprovação da documentação técnica solicitada pela CEF e foram encaminhadas para a etapa de elaboração de contrato e posterior emissão de ordem de serviço para início das obras, são eles:
 - ✓ Empreendimento Santo Afonso II (83 Casas)
 - ✓ Empreendimento Rosa Linda (250 Casas)
 - ✓ Empreendimento Tucumã (16 apartamentos)
 - ✓ Empreendimento Bonsucesso (32 apartamentos)
 - ✓ Empreendimento Rui Lino (64 apartamentos)
4. Abertura de Conta Corrente em nome do empreendimento para finalizar a elaboração do contrato (Santo Afonso II e Rosa Linda);



3. Ações da SEINFRA na Gestão 2021-2023

Durante a atual gestão, a SEINFRA procurou-se corrigir uma grande falha das gestões anteriores que foi a falta de manutenção e reforma dos espaços públicos já existentes no Município.

Dessa forma, em primeiro momento, a SEINFRA priorizou a execução de serviços de manutenção e reforma de quadras, campos de futebol e praças, além da manutenção de vias urbanas e ramais.

3.1 Serviços executados no exercício de 2021

O primeiro ano de mandato do prefeito Tião Bocalom esteve condicionado ao Plano Plurianual 2018-2021, realizado na gestão anterior. O objetivo da prefeitura foi cumprir as metas estabelecidas pelo antigo governo encerrando este ciclo de planejamento e gestão e, ao mesmo tempo, elaborar o Plano Plurianual que nortearia a administração municipal pelos próximos 4 anos (2022-2025).

Os principais destaques da SEINFRA no ano de 2021 foram:

- Manutenção e reformas em 13 quadras, campos de futebol e parques;
- Construção de 351 metros de calçadas;
- Manutenção em 1148 vias, totalizando 278 quilômetros no perímetro urbano;
- Manutenção e revitalização de 3 equipamentos públicos;
- Melhoria de 517 quilômetros de ramais.

Nesse ano, foram investidos mais de 70 milhões no programa Urbanização de Bairros e Obras Públicas.

Quadro 32 - Manutenção/Reforma de Praças e Parques - 2021

Objeto	Bairro	Regional	Valor (R\$)
Praça do Juventus	Bosque	Cadeia Velha	29.498,33
Praça Vila da Amizade	Vila da Amizade	Vila Acre	26.229,82
Praça da Revolução	Centro	Cadeia Velha	111.195,75
Praça e Quadra de Grama Sintética	João Eduardo	Baixada	116.647,53
Praça com Quadra Poliesportiva	Quinze	6 de Agosto	188.383,70
Praça com Quadra	Village Tiradentes	Calafate	252.549,68
Praça e Quadra do Parque Vale do Açai	Vitória	São Francisco	52.061,02
Praça no Parque Chico Mendes	Vila Acre	Vila Acre	26.426,95
Praça e Playground	Novo Horizonte	Floresta	32.113,41
Praça Vila Betel	Vila Betel	Floresta	56.287,41
Praça Bela Vista (Playground)	Bela Vista	Floresta	FGB
Praça Habitar Brasil (Playground)	Habitar Brasil	Floresta	FGB
Praça e Playground	Mutambo	São Francisco	9.948,22
Parque Capitão Ciriaco	6 de Agosto	6 de Agosto	31.904,52
Praça do Tropical	Tropical	Cadeia Velha	58.753,94
Praça Primavera	Manoel Julião	Estação Experimental	FGB



Praça dos Taxistas	Manoel Julião	Estação Experimental	FGB
--------------------	---------------	----------------------	-----

Fonte: SEINFRA, 2024.



Manutenção no parquinho da praça do Village Tiradentes

Quadro 33 - Manutenção/Reforma de Quadras e Campos de Futebol - 2021

Objeto	Bairro	Regional	Valor (R\$)
Quadra Poliesportiva Coberta	João Eduardo	Baixada	121.081,03
Quadra de Futebol de Areia – Rua Maruripi	Vitória	São Francisco	75.499,63
Quadra de Grama Sintética	Nova Estação	Estação Experimental	4.268,42
Quadra de Grama Sintética	Bahia Velha	Baixada	4.852,48
Campo de Futebol	Habitar Brasil	Floresta	36.529,47
Campo de Futebol	Ayrton Senna	Baixada	2.547,62
Quadra Poliesportiva	Vitória	São Francisco	50.629,82
Quadra Poliesportiva Coberta	Bela Vista	Floresta	145.239,55
Quadra de Areia	Jardim Nazle	Floresta	15.518,91
Quadra Poliesportiva	Habitasa	Cadeia Velha	97.916,38
Quadra Poliesportiva	Taquari	6 de Agosto	131.317,62
Quadra poliesportiva	Tucumã	Estação Experimental	140.438,95

Fonte: SEINFRA, 2024.



Manutenção arquibancada quadra Bela Vista



Manutenção Quadra Taquari





Manutenção Quadra João Eduardo

Quadro 34 - Manutenção Preventiva e Corretiva Em Calçadas - 2021

Objeto	Bairro	Regional	Valor
Rua Nossa Senhora de Fátima, desde a Rua Cruzeiro do Sul até a Rua Bom Jesus no bairro Calafate, 351,68 metros (ambos os lados).	Calafate	Calafate	276.039,98

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 35 - Manutenção de Vias Urbanas - 2021

Objeto	Bairro	Regional	Valor
Manutenção de vias urbanas – 278 Km atendidos	Vias de Rio Branco	Vias de Rio Branco	35.138.062,73

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 36 - Manutenção Predial Preventiva e Corretiva - 2021

Objeto
Abrigos Alagação
Reforma prédio Seinfra (Floriano Peixoto)
Centro Cultural Neném Sombra
Mercado da Seis de Agosto

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 37 - Melhoria de Ramais - 2021

Objeto	Bairro	Regional	Valor
Serviços de melhoria em cerca de 517 km de ramais.	Zona Rural de Rio Branco	Rio Branco	7.585.754,82

Fonte: SEINFRA, 2024.

3.2 Serviços executados no exercício de 2022

Em 2022 teve início o ciclo de planejamento projetado pela gestão atual. Na elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, a gestão buscou mudanças de forma a integrar todos os segmentos e áreas técnicas da Prefeitura de Rio Branco na construção dos Programas Temáticos.



No eixo temático de infraestrutura encontram-se os Programas 0301- Modernização da Infraestrutura e de Equipamentos Públicos, e 0302 - Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária e 0303 – Mobilidade Urbana, que visa desenvolver ações que possam melhorar a mobilidade, fluidez, segurança e cidadania para os transportes e o trânsito na cidade de Rio Branco.

Os principais destaques da SEINFRA no ano de 2022 foram:

- manutenção e reformas em 2 praças no município de Rio Branco;
- reformas em 4 quadras e 1 parque no município;
- manutenção/reforma em 9 equipamentos públicos;
- manutenção em 11 academias da comunidade;
- Pavimentação do Ramal do Cinco Mil.
- Construção de academias da comunidade nos Bairros Waldemar Maciel e Raimundo Melo;
- Adequação de sistema de drenagem/sarjeta em 7 áreas de intervenção no município;
- Manutenção preventiva em calçadas em 9 áreas de intervenção;
- Construção de quadras nos Bairros Universitário e Vila Betel.

Quadro 38 - Manutenção/Reforma de Praças e Parques - 2022

Objeto	Bairro	Regional	Valor (R\$)
Praça do Esporte e da Cultura (pista de caminhada e play ground)	Cidade Nova	6 de Agosto	129.859,07
Praça do Bairro Quinze (Playground)	Quinze	6 de Agosto	FGB
Parque Jardim São Francisco (Playground)	Tropical	Cadeia Velha	10.437,78
Praça da Habitasa (Quiosque)	Habitasa	Cadeia Velha	FGB
Parque Capitão Ciriaco (Playground)	6 de Agosto	6 de Agosto	11.315,64
Parque Igarapé São Francisco (Playground)	Procon	Cadeia Velha	11.830,73
Praça com Quadra	Belo Jardim I	Belo Jardim	164.493,92
Praça do Angico (Playground)	Angico	São Francisco	FGB
Praça Olindina Gracino de Lima	Eldorado	São Francisco	FGB
Praça Maria José da Silva de Souza (Quiosque)	Vitória	São Francisco	FGB
Praça do Raimundo Melo (playground e quiosque)	Raimundo Melo	Tancredo Neves	FGB
Praça do Lot. Novo Horizonte (Playground)	Lot. Novo Horizonte	Tancredo Neves	FGB

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 39 - Manutenção/Reforma de Quadras e Campos de Futebol - 2022

Objeto	Bairro	Regional	Valor (R\$)
Quadra de Grama Sintética e Pista de Skate na Praça do Esporte e da Cultura	Cidade Nova	6 de Agosto	116.556,05



Quadra de Futebol de Areia no Parque Capitão Ciríaco	6 de Agosto	6 de Agosto	FGB
Quadra Poliesportiva Coberta (Ginásio) na Praça do Esporte e da Cultura	Cidade Nova	6 de Agosto	45.780,76
Quadra de futebol de areia	Quinze	6 de Agosto	FGB
Quadra poliesportiva	Quinze	6 de Agosto	FGB
Quadra Poliesportiva Mateus da Silva Almeida	Taquari	6 de Agosto	FGB
Quadra poliesportiva na Praça da Habitasa	Habitasa	Cadeia Velha	FGB
Quadra Poliesportiva na Praça Ary Rodrigues	José Augusto	Cadeia Velha	FGB
Quadra de Futebol e Vôlei de Areia e Pista de Skate na Praça do Tropical	Tropical	Cadeia Velha	FGB
Quadra de Futebol de Areia e Campo Society de Grama	Jardim São Francisco	Cadeia Velha	FGB
Quadra de Vôlei de Areia na Praça do Angico	Angico	São Francisco	FGB
Quadra de Futebol de Areia na Praça Olindina Gracino de Lima	Eldorado	São Francisco	150.000,00
Campo de Futebol Society e Quadra de Vôlei de Areia	Vitória	São Francisco	FGB
Quadra de Areia	Calafate	Calafate	77.916,22
Quadra de Grama Sintética	Tucumã	Estação Experimental	53.172,31
Quadra de Futebol de Areia	Cidade do Povo	Belo Jardim	57.690,32
Campo de Futebol e Quadra de Areia	Jacarandá	Belo Jardim	207.979,00
Quadra de Grama Sintética	Raimundo Melo	Tancredo Neves	60.306,70
Quadra de Vôlei de Areia	Raimundo Melo	Tancredo Neves	FGB
Quadra de Futebol de Areia	Xavier Maia	Tancredo Neves	FGB
Quadra de Futebol de Areia	Lot. Novo Horizonte	Tancredo Neves	FGB
Quadra de Areia	Recanto dos Buritis	Belo Jardim	24.007,87
Quadra Poliesportiva	Belo Jardim I	Belo Jardim	FGB
Quadra de Futebol de Areia	Santa Inês	Belo Jardim	FGB
Quadra de Grama Sintética	Nova Estação	Nova Estação	4.268,42

Fonte: SEINFRA, 2024.



Pista de Skate na Cidade Nova





Quadra da Cidade Nova



Quadra do Belo Jardim

Quadro 40 – Manutenção de Equipamentos Públicos

Objeto	Ano
Telhamento e Construção da Calha no Mercado Seis de Agosto	2022
Instalações de Divisórias Eucatex no CAC Mercado XV	2022
Instalações de Tubos e Conexões no Terminal Urbano de Rio Branco	2022
Execução de Pintura na Estrutura Metálica do Mercado Aziz Abucater	2022
Pintura de Estrutura Metálica Prédio Defesa Civil (Expoacre)	2022
Melhoria Pintura de Estrutura Metálica Prédio da Defesa Civil na Expoacre (Alagação)	2022
Reforma instalação elétrica CEASA	2022
Reforma Nova Sede SEINFRA - Mira Shopping	2022
Melhoria Mercado Da 06 De Agosto	2022

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 41 - Manutenção de Academias

Objeto	Bairro	Regional	Ano	valor
Academia popular	Horto Florestal	Cadeia Velha	2022	28.382,48
Academia popular	Parque Jardim São Fco	Cadeia Velha	2022	
Academia popular	Parque Chico Mendes	Vila Acre	2022	26.202,05
Academia popular	Bela Vista	Floresta	2022	
Academia popular	Vila Betel	Floresta	2022	
Academia popular	Castelo Branco	Floresta	2022	
Academia popular	Praça do Juventus	Cadeia Velha	2022	30.725,26
Academia popular	Cohab do Bosque	Cadeia Velha	2022	
Academia popular	Roney Meireles	Tancredo Neves	2022	



Academia popular	Tucumã	Estação Experimental	2022	22.724,55
Academia popular	Ipê	Calafate	2022	
Academia popular	Universitário	Estação Experimental	2022	
Academia popular	Oscar Passos	Tancredo Neves	2022	59.055,44
Academia popular	Santa Mônica	Tancredo Neves	2022	
Academia popular	Manoel Julião	Estação Experimental	2022	
Academia popular	Tropical	Cadeia Velha	2022	54.994,48
Academia popular	Bairro Canaã	Seis de Agosto	2022	
Academia popular	Plácido De Castro	Baixada	2022	
Academia popular	Mutambo	São Francisco	2022	
Academia popular	Adalberto Aragão	Cadeia Velha	2022	
Academia popular	Cidade Nova	Seis de Agosto	2022	50.561,32
Academia popular	Calafate	Calafate	2022	
Academia popular	Mascarenhas De Moraes	Floresta	2022	
Academia popular	Esperança	Floresta	2022	50928,34
Academia popular	Tancredo Neves	Tancredo Neves	2022	
Academia popular	Cadeia Velha	Cadeia Velha	2022	
Academia popular	Belo Jardim I	Belo Jardim I	2022	30.928,55
Academia popular	Recanto dos Buritis	Belo Jardim I	2022	
Academia popular	Preventório	Baixada	2022	30.928,55
Academia popular	Horto Florestal II e III	Cadeia Velha	2022	
Academia popular	Triângulo	Seis de Agosto	2022	

Fonte: SEINFRA, 2024.



Academia Valdemar Maciel

Quadro 42 - Melhorias para Escoamento da Produção

Objeto	Bairro	Regional	Ano	valor
Pavimentação Ramal do Cinco Mil	Km 03 AC-10	Tancredo Neves	2022	3.838.158,59

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 43 - Construção de Academias Populares

Objeto	Bairro	Regional	Valor (R\$)	Ano
Construção de Academia ao Ar Livre	Waldemar Maciel	Calafate	128.408,88	2022
Construção de Academia ao Ar Livre	Jardim Primavera	Estação Experimental	87.951,24	2022
Construção de Academia ao Ar Livre	Raimundo Melo	Tancredo Neves	80.799,11	2022

Fonte: SEINFRA, 2024.



Quadro 44 – Sistema de Drenagem Municipal de Rio Branco

Ação: Sistema de Drenagem Municipal de Rio Branco	
Objeto	Ano
Drenagem na Trav. Portela - Bairro José Augusto	2022
Drenagem - Rua Novo Horizonte - bairro Pista	2022
Sarjeta Rua Frei Tiago	2022
Sarjeta travessa Livramento	2022
Sarjeta Na Travessa São Jorge	2022
Drenagem Rua São João	2022
Drenagem Travessa Santa Inês E Travessa Da Serra	2022

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 45 – Programação de Calçadas

Ação: Manutenção Preventiva E Corretiva Em Calçadas.	
Objeto	Ano
Calçada Da Praça Do Bairro Vila Betel	2022
Calçada Praça Da Juventude - Cidade Nova	2022
Calçada URAP Do Taquari	2022
Calçada - Cidade Nova	2022
Calçadas Do Bairro Santa Inês	2022
Calçadas – Calçadão Da Benjamin Constant	2022
Calçadas – Calçadão Da Av. Getúlio Vargas	2022
Calçadas Do Bairro Raimundo Melo	2022
Calçadas Do Conjunto Esperança (Apae)	2022

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 46 - Construção de Praças e Quadras

Objeto	Bairro	Regional	Valor (R\$)	Ano
Construção Quadra	Vila Betel	Floresta	352.458,96	2022
Construção de Praça	Universitário	Estação Experimental	587.173,91	2022

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 47 – Contrução e Manutenção de Pontes

Ação: Construção e Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias				
Objeto	Bairro	Regional	Ano	valor
Manutenção Ponte	Canaã Belo Jardim	Seis de agosto	2022	
Manutenção Ponte	Ramal da Castanheira	Seis de agosto	2022	196.491,79
Manutenção Ponte	Tropical (Beco do Tripa)	Cadeia Velha	2022	165.658,95
Manutenção Ponte	Esperança	Floresta	2022	52.791,89
Manutenção Ponte	Tucumã	Estação Experimental	2022	13.476,45
Manutenção Ponte	Aldeia	Cadeia Velha	2022	16.691,15
Manutenção Ponte	Nova Estação (Canal)	Estação Experimental	2022	23.076,16
Manutenção Ponte	Estação Experimental	Estação Experimental	2022	4.876,58
Manutenção Ponte	Tancredo Neves (Beco do Sandro)	Tancredo Neves	2022	12.730,99
Manutenção Ponte	Tropical (Beco do Tripa II)	Cadeia Velha	2022	29.267,17
Manutenção Ponte	Geraldo Fleming	Estação Experimental	2022	25.958,93
Manutenção Ponte	Santa Inês	Belo Jardim	2022	116.456,53
Manutenção Ponte	Canaã	Seis de Agosto	2022	
Manutenção Ponte	Segunda Ponte do Ramal do Benfica	Vila Acre	2022	89.675,13
Manutenção Ponte	Ramal Jarbas Passarinho	São Francisco	2022	209.396,40
Manutenção Ponte	Jardim Primavera	Estação Experimental	2022	16.612,93



Manutenção Ponte	Juarez Távora	Tancredo Neves	2022	35.433,69
Manutenção Ponte	Ramal do Panorama	São Francisco	2022	85.018,86
Manutenção Ponte	Taquari	Taquari	2022	98.017,60
Manutenção Ponte	Quixadá	São Francisco	2022	89.349,83
Manutenção Ponte	Jardim Primavera	Estação Experimental	2022	17.616,70
Manutenção Ponte	Estrada Dias Martins	Estação Experimental	2022	215.630,11
Manutenção Ponte	Quixadá	São Francisco	2022	120.784,95
Manutenção Ponte	Taquari	Seis de Agosto	2022	32.226,49
Manutenção Ponte	Preventório	Baixada	2022	15.550,64
Manutenção Ponte	Piçarreira	Estação Experimental	2022	50.375,18
Manutenção Ponte	Vila Betel	Floresta	2022	45.966,52
Manutenção Ponte	Nova Esperança	Floresta	2022	7.279,97
Manutenção Ponte	Capitão Ciríaco	6 de agosto	2022	100.715,31
Manutenção Ponte	Esperança	Floresta	2022	21.849,10

Fonte: SEINFRA, 2024.



Passarela do Tropical



Passarela no Juarez Távora

Quadro 48 – Manutenção de Vias

Ação: Manutenção de Vias Urbanas			
Objeto	Bairro	Ano	valor
Manutenção de vias urbanas	560	2022	52.010.455,62

3.3 Serviços executados no exercício de 2023

2023 foi um ano de grandes realizações para a SEINFRA. Passados os dois anos de restrição das atividades decorrentes da pandemia do COVID-19, 2023 teve, além dos serviços recorrentes de manutenção e melhorias, a construção de novos equipamentos públicos

- Investimentos em 6 equipamentos públicos;
- Manutenção em 11 academias comunitárias;
- Construção de 1 quadra poliesportiva;
- Manutenção de calçadas em 5 vias;
- Serviços de drenagem em 4 vias;
- Manutenção/reforma em 18 campos de futebol e quadras esportivas;
- Manutenção/reforma em 8 praças, parques e áreas de lazer;
- Manutenção de 11 equipamentos públicos;
- Manutenção de 355km de vias urbanas;
- Implantação do Programa “Recupera Rio Branco”;



- Pavimentação em 17 vias;
- Construção e manutenção de 9 pontes, passarelas e escadarias.

Quadro 49 – Investimento em equipamentos públicos

Ação: Investimento em equipamentos públicos	
Objeto	Ano
Construção do Terminal de passageiros da Avenida Ceará - início	2023
Construção de Feira Popular do Calafate	2023
Construção de Sobrados Geminados no Loteamento Santo Afonso	2023



Espaço para Feira Popular do Calafate



Sobrados Geminados no Santo Afonso

Quadro 50 – Manutenção de Academias

Ação: Manutenção de academias	
Objeto	Ano
Manutenção Academia do Horto Florestal	2023
Manutenção Academia do Bairro Triângulo	2023
Manutenção Academia do Bairro Chico Mendes	2023
Manutenção Academia do Bairro XV	2023
Manutenção Academia do Bairro Canaã	2023
Manutenção Academia do Bela Vista	2023
Manutenção Academia do Bairro Manoel Julião	2023
Manutenção Academia do Recanto dos Buritis	2023
Manutenção Academia do Mascarenhas de Moraes	2023
Manutenção Academia do Conjunto Esperança	2023
Manutenção Academia do Bairro Waldemar Maciel	2023

Fonte: SEINFRA, 2024.



Quadro 51 - Construção de Academias Populares e Quadras

Objeto	Bairro	Regional	Valor (R\$)	Ano
Construção de Quadra Poliesportiva	Canaã	Belo Jardim	269.561,83	2023

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 52 – Programa de Calçadas

Ação: Manutenção Preventiva E Corretiva Em Calçadas.

Objeto	Ano
Calçada no Bairro Cidade Nova	2023
Calçada no Bairro Jacarandá	2023
Calçada na Avenida Antônio da Rocha Viana	2023
Calçada na Estrada do Mutum	2023
Calçada na Rodovia AC-40	2023

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 53 – Sistema de Drenagem

Ação: Sistema de Drenagem Municipal de Rio Branco

Objeto	Ano
Drenagem Travessa Santa Inês	2023
Drenagem Travessa da Serra	2023
Drenagem Subterrânea entre os Bairros Carandá e Bahia	2023
Drenagem Estrada da Floresta	2023

Quadro 54 - Manutenção/Reforma de Quadras e Campos de Futebol

Objeto	Bairro	Regional	Valor (R\$)	Ano
Quadra de futebol Society	Triângulo Velho	6 de Agosto	158.491,33	2023
Quadra de futebol Society	Bela Vista	Floresta	39.579,78	2023
Quadra de Futebol Society	Conj. Eperança I	Floresta	FGB	2023
Quadra de Futebol Society	Habitar Brasil	Floresta	FGB	2023
Quadra de Vôlei de Areia	Cohab do Bosque	Cadeia Velha	FGB	2023
Quadra de Futebol de Areia na Praça Do Juventus	Bosque	Cadeia Velha	FGB	2023
2 Quadras de Vôlei de Areia na Praça do Juventus	Bosque	Cadeia Velha	FGB	2023
Quadra de Vôlei e Futebol de Areia	Jardim Nazle	Cadeia Velha	FGB	2023
Quadra de Vôlei, Quadra de Futebol de Areia e Playground	Mocinha Magalhães	Estação Experimental	176.401,46	2023
Quadra de Grama Sintética	Tangará	Estação Experimental	150.000,00	2023
Quadra Poliesportiva	Carandá	Baixada	148.700,05	2023
Quadra Poliesportiva	Triângulo Velho	6 de Agosto	135.438,48	2023
Quadra de Vôlei e Futebol de Areia	Pedro Roseno	Calafate	65.605,48	2023
Quadra Poliesportiva	Aeroporto Velho	Baixada	67.515,71	2023
Quadra de Futebol	Santa Mônica	Tancredo Neves	110.470,90	2023
Quadra de Grama Sintética Coberta	Santa Cecília	Belo Jardim	226.521,09	2029
Campo de Futebol de Areia	Rosalinda	Belo Jardim	24.444,36	2023
Quadra de Grama Sintética	Xavier Maia	Tancredo Neves	200.000,00	2023
Quadra Poliesportiva Coberta	Jorge Lavocat	Tancredo Neves	FGB	2023
Quadra de Vôlei de Areia	Jorge Lavocat	Tancredo Neves	FGB	2023



Quadra de Futebol de Areia	Lot. Santa Mônica	Tancredo Neves	FGB	2023
Quadra Poliesportiva	Cabreúva	Baixada	200.000,00	2023
Quadra Poliesportiva	Calafate	Calafate	200.000,00	2023
Quadra de Futebol de Areia	Edson Cadaxo	São Francisco	FGB	2023
Quadra Poliesportiva	Vitória	São Francisco	FGB	2023
Quadra de Futebol de Areia na Praça Vale do Açaí	Chico Mendes	São Francisco	FGB	2023
Campo de Futebol de Areia	Xavier Maia	Tancredo Neves	52.082,12	2023
Campo de Futebol e Quadra de Areia	Jacarandá	Belo Jardim	47.056,36	2023
Campo Society de Futebol	Vila Verde	Área Rural	FGB	2023



Manutenção de quadra no Bairro Calafate



Manutenção de campo de areia e playground no Bairro Mocinha Magalhães



Manutenção de quadra no Bairro Xavier Maia



Quadro 55 - Manutenção/Reforma de Praças e Parques

Objeto	Bairro	Regional	Valor (R\$)	Ano
Praça Amélia Araripe (playground)	Cohab do Bosque	Cadeia Velha	120.000,00	2023
Complexo Esportivo (Quadra Poliesportiva, Quadra de Vôlei de Areia e Pista de Skate)	Universitário	Estação Experimental	255.433,05	2023
Playground e Quadrilhódromo	Habitar Brasil	Floresta	24.911,50	2023
Quadrilhódromo	Plácido de Castro	Baixada	27.018,16	2023
Quadrilhódromo	Santa Inês	Belo Jardim	11.848,86	2023
Quadrilhódromo	Iolanda	Estação Experimental	23.662,72	2023
Praça José Maria Moura Magalhães (playground)	Edson Cadaxo	São Francisco	148.801,43	2023
Praça do Juventus	Bosque	Cadeia Velha	281.901,43	2023
Praça Vale do Açaí (playground)	Chico Mendes	Bosque	FGB	2023
Praça Jorge Lavocat (playground)	Jorge Lavocat	Tancredo Neves	FGB	2023
Praça do Conj. Bela Vista (playground)	Bela Vista	Floresta	FGB	2023

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 56 – Manutenção de Equipamentos Públicos

Ação: Manutenção de Equipamentos Públicos	
Objeto	Ano
Reforma na sede da Prefeitura de Rio Branco	2023
Pintura na fachada do Terminal Urbano	2023
Reforma no Shopping Aquiri	2023
Revitalização do Centro Cultural do Taquari	2023
Revitalização do Parque Capitão Ciríaco	2023
Reforma Fundação Garibaldi Brasil	2023
Reforma CRAS da Sobral	2023
Melhoria Centro da Juventude Cidade Nova	2023
Manutenção Predial na sede da SEINFRA	2023
Manutenção guarda-corpo na Amadeo Barbosa	2023
Revitalização da Via Chico Mendes	2023

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 57 – Manutenção de Vias

Ação: Manutenção de Vias Urbanas		
Objeto	Ano	valor
Manutenção de vias urbanas – 355 km	2023	44.617.952,51
Implantação do programa "Recupera Rio Branco"	2023	30.000.000,00

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 58 – Pavimentação de Vias

Ação: Pavimentação de Vias Urbanas		
Objeto	Ano	valor
17 vias pavimentadas	2023	7.265.487,31

Fonte: SEINFRA, 2024.

Quadro 59 – Construção e Manutenção de Pontes

Ação: Construção e Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias	
Objeto	Ano
Passarela entre Bairro Geraldo Fleming e Bairro da Paz	2023
Passarela do Parque Capitão Ciríaco	2023





Ponte do Judia (início)	2023
Ponte da Estrada Jarbas Passarinho	2023
Passarela na Travessa Pescador	2023
Passarela Metálica do Recanto dos Buritis	2023
Passarela na Travessa Praxedes	2023
Passarela do Raimundo Maia	2023
Ponte do Ramal do Brindeiro	2023

Fonte: SEINFRA, 2024.



VI. PRINCIPAIS DESTAQUES DE SERVIÇOS E PROJETOS REALIZADOS EM 2024 PELA SEINFRA.

1. Ação: Investimentos em equipamentos Públicos



Elevatório de esgoto – Bairro da Paz



Quadra sintética descoberta – Avenida Getúlio Vargas



Sede da Câmara Municipal de Rio Branco





Quadra de Grama Sintética no Bairro Vila Ivonete



Quadra de Grama Sintética no Bairro Israel Lira



Construção de Espaço de Esporte e Lazer no Bairro Castelo Branco





Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Jequitibá



Terminal de Passageiros da Av. Ceará



Ampliação da Casa de Cultura





Novo Mercado Elias Mansour

2. Ação: Plano Diretor do Município de Rio Branco



Reunião no dia 10/05/2024



Reunião no dia 12/06/2024



Reunião no dia 16/07/2024



3. Ação: Revitalização e Manutenção de Equipamentos Públicos

- Manutenção de Academias Populares



Manutenção Preventiva na Academia do Bairro Esperança



Manutenção Preventiva na Academia da Praça da Juventus



Manutenção na Academia do Bairro Benfica



Manutenção na Academia da Vila da Amizade





Manutenção Preventiva na Academia do Bairro Pedro Roseno

- **Manutenção de Mercados**



Manutenção no Mercado Elias Mansour



Manutenção no Mercado Aziz Abucater

- **Manutenção de Terrenos**



Aterro na Regional São Francisco para Construção de Quadra do Eldorado – Antes e Depois





Desvio do Igarapé Redenção – antes e depois

- **Manutenção de Instalações**



Reforma na Sede da AMAC



Pintura e Instalação de Mictórios na Sede da SEINFRA



- **Manutenção de Praças e Quadras**



Reforma na Praça da Cidade Nova



Reforma de Quadra Coberta no Bairro Bela Vista – Antes e Depois



Reforma na Praça do Bairro Judia



4. Ação: Manutenção de Vias Urbanas



Remendo Asfáltico na Avenida Ceará



Drenagem na Rua Barbosa Lima



Estrada Raimundo Irineu Serra





Rua Isaura Parente



Rua José Magalhães



Avenida Juscelino Kubitschek





Travessa Caramuru



Rua Maria Tapajós

5. Ação: Pavimentação de Vias Urbanas



Rua Tio Aldorico – Antes e Depois





Ramal do Herculano – Antes e Depois



Asfaltamento na Estrada do Calafate



Rua Buriti – Antes e Depois





Rua Cacau – Antes e Depois



Rua Hélio Melo – Antes e Depois



Rua Jambo – Antes e Depois





Rua Gabriel – Antes e Depois



Estrada Panorama – Antes e Depois



Rua Dois – Antes e Depois





Asfaltamento na Rua Adalberto Torres



Asfaltamento na Rua Verano R. Pinto



Asfaltamento na Rua Aureliano Lopes





Asfaltamento na Rua do Tucumã



Rua Preciosa – Antes e Depois



Travessa Manga Larga – Antes e Depois





Pavimentação Rua Major Gesner




Rua Manga – Antes e Depois



Asfaltamento na Rua Aripunã



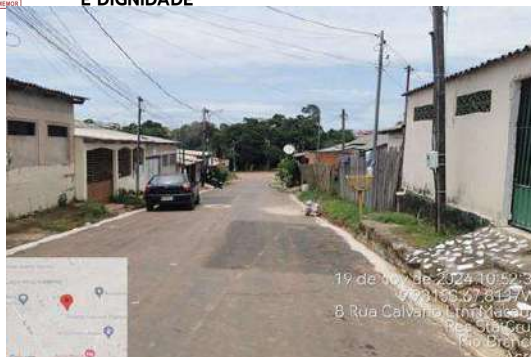

Travessa Pequii – Antes e Depois



Rua Maria Atenas – Antes e Depois




Travessa Santo Antônio – Antes e Depois






Rua Botafogo – Antes e Depois

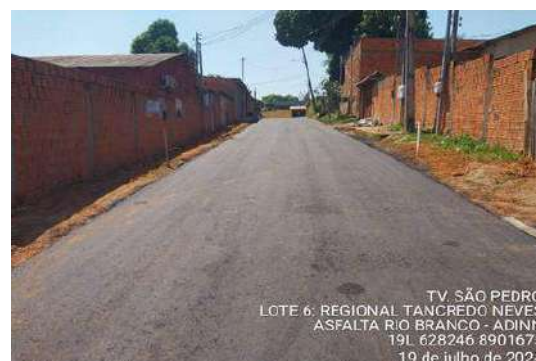

Travessa São Pedro – Antes e Depois

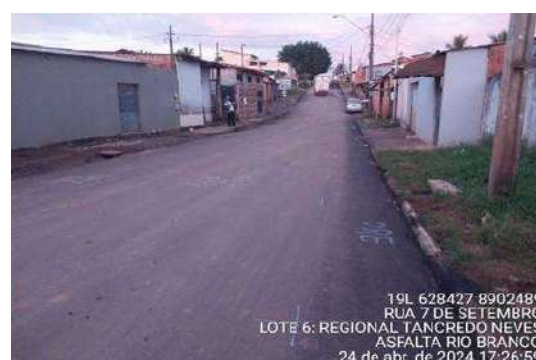

Rua 7 de Setembro – Antes e Depois





Rua Tarumã – Antes e Depois



Rua Baixa Verde – Antes e Depois



Estrada Irineu Serra – Antes e Depois





Rua Monte Sinai – Antes e Depois



Avenida dos Ipês – Antes e Depois



Afultamento na Rua Beija Flor





Rua São João – Antes e Depois



Asfaltamento na Travessa do Mineiro



Travessa Bom Jesus



Rua Olavo Bilac





Asfaltamento na Rua do Acre



Ramal Garapeira



Asfaltamento na Rua Epaminondas Jácome





Asfaltamento na Avenida Ceará



Rua Senador Guimard



Rua Paz



Rua Brasília



Rua Sena Madureira





Rua Ademar de Barros



Rua A



Travessa Campo Verde – Antes e Depois



Rua Santa Helena – Antes e Depois





Rua Luzia Ferreira – Antes e Depois



Rua 25 de Março – Antes e Depois



Rua Maria Atenas – Antes e Depois



Assinado com senha por ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA em 07/03/2025 - 06:52hs.
Documento Nº: 437301.2909929-5281 - consulta à autenticidade em
<http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=437301.2909929-5281>




SEINFRAOFI202500422



Travessa Mossoró – Antes e Depois



Rua Belém – Antes e Depois

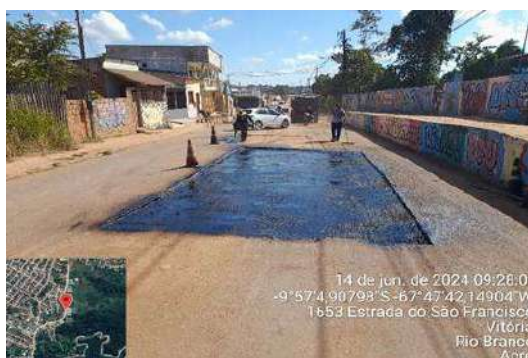

Estrada do São Francisco





Rua Baguary



Rua Marajá



Travessa Azeitona



Travessa Neto



Travessa Santa Rita





Rua Lima Verde



Rua Sete de Setembro



Ramal do Macarrão



Travessa Castanheira

6. Ação: Melhoria da Infraestrutura Viária para Escoamento da Produção



Ramal Vertente



Ramal Estrada Velha



Assinado com senha por ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA em 07/03/2025 - 06:52hs.
Documento Nº: 437301.2909929-5281 - consulta à autenticidade em
<http://rbdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=437301.2909929-5281>



SEINFRAOFI202500422

7. Ação: Qualificação da Infraestrutura de Corredores de Transporte Público (antigo)



Rua Isaías



Rua São Raimundo



Rua Glória



Rua 10 - calçadas



Rua Isaías - calçadas



8. Ação: Construção e Manutenção de Academias Populares



Academia do Recanto dos Buritis



Academia do Ramal do Benfica



Academia do Juarez Távora



Academia do Xavier Maia



Academia da Estação Experimental



9. Ação: Programa de Calçadas



Rua Monte Roraima



Estrada do Mutum



Avenida Antônio da Rocha Viana



10. Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer



Decoração natalina na Av. Getúlio Vargas e Na Sede da Prefeitura

11. Ação: Construção e Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias



Manutenção de ponte na Travessa do Pescador




Manutenção de Ponte sobre o Igarapé São Francisco – Antes e Depois





Manutenção de Passarela na BR 364 próxima ao Universitário – Antes e Depois

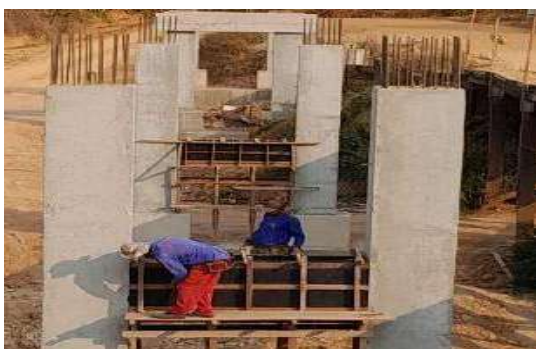

Construção de Ponte sobre o Rio Caipora



Construção e Inauguração de Ponte sobre o igarapé judia





Construção de Ponte Sobre o Igarapé Redenção



Construção de Passarela entre Aeroporto Velho e Ayrton Senna

12. Ação: Modernização e Revitalização Administrativa



Aquisição de mobília e equipamentos





Instalação de catracas para registro de entrada e saída

13. Ação: Programa de Obras Públicas



Canteiro de Obras - Praça com contenção de encosta



Construção da Indústria de Produção de Leite de Soja (Vaca Mecânica)





Construção do Viaduto na Rotatória da AAB



Construção do Elevado na Estrada Dias Martins

14. Alagação 2024



Confecção dos Abrigos para famílias atingidas pelas enchentes





Confeção dos Abrigos para famílias atingidas pelas enchentes

15. Aquisição de Máquinas e Equipamentos



Rolo Compactador



Espargidor de Asfalto Rebocável



Trator



Caçamba





Motoniveladora



Rolo compactador



VI. RESULTADOS E CONCLUSÕES

Os constantes desafios e as questões sociais, em seus mais diversos níveis de complexidade, surgem a cada dia, exigindo respostas do poder público e da sociedade no sentido de potencializar os serviços e construir, junto à comunidade, formas alternativas e responsáveis de engrandecimento social.

Os recursos públicos gerenciados pela SEINFRA, foram aplicados de forma responsável e tiveram os seus resultados expressos na melhoria da qualidade de vida da população, proporcionando uma nova perspectiva de vida para enfrentamento dos paradigmas sociais vividos pelas comunidades carentes - com senso do seu compromisso social e de cidadania, além da qualidade de sua formação social.

As execuções das ações no setor de construção resultaram em desembolsos financeiros significativos, porém, necessários a manutenção das vias e equipamentos urbanos da cidade de Rio Branco.

A exposição dos dados é base para o aperfeiçoamento da gestão e melhoria na qualidade de vida da população consolidando o respeito e responsabilidade para com a Administração Pública.

Com as novas propostas apresentadas no PPA 2022-2025, tem como prioridade a inovação, modernização e crescimento econômico para o município de Rio Branco, fazendo com que tenhamos um destaque a nível nacional como cidade inteligente. Sabe-se que muito tem a ser feito, a SEINFRA tem um desafio imenso para contemplar as metas previstas no Plano Plurianual. Mas com o investimento de capital físico e humano, é possível realizar todos os objetivos previstos no plano de governo.

Rio Branco, 28 de novembro de 2024.

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Decreto Municipal nº 049/2023

